COMISSÃO DA CEDEAO

ECOWAS COMMISSION COMMISSION DE LA CEDEAO

**Improved Regional Fisheries Governance in Western Africa Programme (PESCAO)**

**A project funded by the European Union**

UNION EUROPEENNE

# RAPPORT NARRATIF FINAL
# DU PROGRAMME PESCAO : *« Amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest »*

**Contrat de subvention FED/2017/392-671**

**(Du 3 mai 2018 au 30 avril 2023)**

*CSRP, JUIN 2023*

ECOWAP

*« …ECOWAS OF*

EUROPEAN UNION

# Table des matières

Liste des acronymes utilisés dans le rapport……4

Liste des tableaux
Tableau n°1 : Groupes cibles du projet...……5
Tableau n° 2 : Groupes cibles mobilisés dans la mise en œuvre de l'action..……..10
Tableau n° 3 : Synthèse des extrants, des activités planifiées et de leurs états d'avancement.11
Tableau n°4 : Synthèse des Résultats des 14 opérations de surveillances……27

Liste des figures
Figure n°1 : Pavillon des 85 navires arraisonnés…….……27
Figure n°2 : Présentation des infractions en fonction de la définition de la pêche INN par le plan d'action international de la FAO ……..28
Figure n°3 : Présentation des marchés attribués dans la période de référence……61

I. RAPPORT NARRATIF ..... 5
1. Description ..... 5
1.8. Résumé de l'action ..... 6
1.9. Résultats et activités ..... 8
A. RESULTATS ..... 8
B. ACTIVITES ..... 18
A 1.1 : Examiner et mettre à jour les lois/règlements nationaux de pêche conformément aux conventions et instruments internationaux (y compris les ORGP). ..... 18
A 1.2 : Elaborer 2 plans d'action nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN sur requête des EM. ..... 18
A 2.1 : Opérationnaliser /développer des accords de coopération pour le suivi, le contrôle et la surveillance. ..... 18
A 2.2 : Opérationnaliser le registre sous régional des navires de pêche. ..... 19
A 2.3 : Développer les renseignements, la gestion des risques et une meilleure planification stratégique du SCS ..... 20
A 2.4 : Etablir/renforcer la coopération inter agences et interministérielle au niveau national.... 20
A 2. 5 : Renforcer la coopération avec d'autres organisations impliquées dans la lutte contre la pêche INN. ..... 20
A 3.1 : Doter l'unité de coordination SCS de la CSRP d'un véhicule et d'une motocyclette pour assurer la mobilité du centre opérationnel de Banjul ..... 21
A 3.2 : Améliorer les services de télécommunication entre le centre des opérations des États membres et celui de l'unité de coordination SCS de la CSRP. ..... 21
A .3.4 : Garantir un approvisionnement fiable en énergie électrique des installations régionales du DSCSA/UCOS ..... 22
A.3. 5 : Renforcer les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals engagés dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches. .. 22
A 3. 6 : Acquisition de tenues et d'équipements SCS aux Inspecteurs des Etats membres de la CSRP. ..... 22
A 4.1 : Renforcer les capacités des inspecteurs des pêches et du personnel des Gardes Côtes.... 23
A 4.2 : Organiser des séances d'échanges d'expérience sur la pêche INN. ..... 24
A 4.3 : Renforcer les capacités des opérateurs des centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux et d'autres personnel SCS. ..... 25

A 5.1 : Planifier et mener des opérations conjointes (aériennes et maritimes), y compris l'affrètement éventuel de navires/d'avions. ... 25
A 6 : Coordination du projet. ... 28
1.10. Utilisation des acquis et durabilité. ... 30
2.4. Matrice-cadre logique mise à jour ... 31
2.5. Prise en compte du genre ... 51
2.6. Suivi et évaluation des activités ... 51
2.7. Suivi des modifications. ... 51
2.8. Leçons apprises et réplication de l'action. ... 52
2.9. Liste des documents produits pendant la mise en œuvre de l'action ... 53
2.10. Récapitulation des marchés attribués pendant la période de référence ... 55
3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération ... 62
3.1. Relations entre la CSRP et les autorités publiques des Etats membres. ... 62
3.2. Relations entre la CSRP et la DUE-Dakar ... 62
3.3. Relations avec les autres organisations prenant part à la mise en œuvre de l'action ... 62
3.4. Consolidation des acquis des autres subventions antérieures reçues de l'UE ... 63
4. Visibilité et Communication sur l'action ... 64
5. Lieu d'archivage des dossiers, documents comptables et pièces justificatives ... 64
Annexe 1 : Liste des navires arraisonnés et des infractions. ... 65

## Liste des acronymes utilisés dans le rapport

| | |
|---|---|
| **AECP** | Agence européenne de contrôle des pêches |
| **AIS** | Automatical Identification system (Système d'identification automatique) |
| **ARSTM-ISMI** | Académie Régionale des Sciences et des Techniques de la Mer- Institut de Sécurité Maritime Interrégional |
| **CEDEAO** | Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest |
| **CMM** | Chef de mission maritime |
| **CMA** | Chef de mission aérienne |
| **CPCO** | Comité des Pêches pour le Centre-Ouest du Golfe de Guinée |
| **CSRP** | Commission Sous Régionale des Pèches |
| **CSP** | Centre de surveillance des pêches |
| **DUE-Dakar** | Délégation d'Union européenne à Dakar |
| **DSCSA** | Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l'Aménagement des Pêches |
| **GTSCS** | Groupe de travail suivi, contrôle et surveillance |
| **INN** | Illicite, non déclarée et non réglementée |
| **MAVA** | Fondation pour la nature |
| **ODD** | Objectif du développement durable |
| **OMD** | Objectifs du millénaire pour le développement |
| **ORP** | Organisations régionales des pêches |
| **PMA** | Pays moins avancés |
| **PRAO** | Programme régional des pêches de l'Afrique de l'Ouest |
| **SCS** | Suivi, Contrôle et Surveillance |
| **TIDM** | Tribunal international du droit de la mer |
| **UEMOA** | Union économique monétaire ouest africaine |
| **VMS** | Vessel Monitoring **S**ystem |
| **ZEE** | Zone économique exclusive |

# I. RAPPORT NARRATIF

## 1. Description

**1.1.** Nom du coordinateur du contrat de subvention : **Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP)**

**1.2.** Nom et fonction de la personne de contact : **Dr Khallahi BRAHIM**, **Secrétaire Permanant**

**1.3.** Intitulé de l'action : **Contribution à la prévention et aux mesures de lutte contre la pêche illicite non-déclarée et non-Règlementée (pêche INN) par l'amélioration du Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) au niveau national et régional**

**1.4.** Numéro du contrat : **N° FED / 2017 / 392 – 671** et **Avenant 1 au contrat N°FED / 2017 / 392 – 671**

**1.5.** Date de début et date de fin de la période de référence : **le 03 mai 2018 et le 30 avril 2023**

**1.6.** Pays ou région(s) cible(s): **Ensemble des 7 Etats membres de la CSRP (Cabo Verde, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Léone)**

**1.7.** Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles[1] (si différents) (y compris le nombre de femmes et d'hommes):

**1.7.1.** Bénéficiaires finaux : Populations des États membres, Communautés de pêcheurs, Gouvernements des Etats membres, tout public au sens large.

**1.7.2.** Groupes cibles : Ensemble des sept Etats membres de la CSRP, les structures nationales concernées par la surveillance des pêches et par la gestion des ressources halieutiques, les professionnels du secteur de la pêche, les opérateurs économiques qui travaillent dans le cadre du respect de la réglementation et les populations du littoral. Le tableau 1 présente les groupes cibles.

**Tableau n°1 : Groupes cibles du projet**

| Etat membre | Ministère | GTSCS | Cadres SCS | Inspecteurs | | Observateurs | | Opérateurs | Juristes | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nbre | Age moyen | Nbre | Age moyen | | | |
| **Cabo Verde** | 1 | 1 | - | 19 | - | - | - | 20 | 2 | 43 |
| **Gambie** | 1 | 1 | 2 | 04 | 25 | 80 | 25 | 4 | 2 | 94 |
| **Guinée** | 1 | 1 | 30 | 40 | 53 | 100 | 45 | 10 | 2 | 184 |
| **Guinée Bissau** | 1 | 1 | 42 | 57 | 45 | 112 | 32 | 13 | 2 | 228 |
| **Mauritanie** | 1 | 1 | 35 | 70 | 35 | 50 | 50 | 30 | 2 | 189 |
| **Sénégal** | 1 | 1 | 15 | 16 | 40 | 19 | 55 | 2 | 2 | 56 |
| **Sierra Léone** | 1 | 1 | 177 | 09 | 42 | 137 | 39 | 17 | 2 | 344 |
| **TOTAL** | 7 | 7 | 301 | 215 | 40 | 498 | 41 | 96 | 14 | 1 138 |

**NB :** La valeur de référence pour la participation des femmes aux formations est définie comme suit :

- 20% de femmes pour 70 inspecteurs formés.
- 10% de femmes pour 70 observateurs formés.

[1] Les « groupes cibles » sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau de l'objectif du projet, et les « bénéficiaires finaux » sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau de la société ou d'un secteur en général.

## Évaluation de la mise en œuvre des activités de l'action

### 1.8. Résumé de l'action

Du **03 mai 2018 au 30 avril 2023**, la CSRP, en collaboration avec les autorités administratives et les structures techniques des sept (07) Etats membres (EM), a mis en œuvre avec succès l'Action pour un coût global de 3 625 000 Euros, avec l'appui technique de l'AECP, le suivi et la supervision de la DUE Dakar et de la CEDEAO. Les extrants réalisés au niveau des EM sont jugés très efficaces et satisfaisants et concernent principalement les activités relatives à l'alignement des cadres juridiques des EM avec les normes internationales, le renforcement des capacités des structures en charge du Suivi, du Contrôle et la Surveillance (SCS) des pêches et la mutualisation des moyens techniques et matériels afin de lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementaire (pêche INN). Les progrès enregistrés ont contribué à l'atteinte des 5 résultats ci-après :

**R1.** L'harmonisation des cadres juridiques des pêches en conformité aux normes internationales de lutte contre la pêche INN, dont le niveau de réalisation des livrables est satisfaisant. L'AECP a apporté 5 assistances techniques à 3 EM ***(soit un taux de réalisation de 71, 43%)***, notamment, **i.** l'examen et l'analyse du cadre juridique des pays de la CSRP et du CPCO sur la pêche INN ; **ii.** l'élaboration d'un Projet de décret-loi sur la pêche du Cabo Verde ; **iii.** la révision et de la mise à jour du Plan d'action nationale de lutte contre la pêche INN (PAN-INN) du Cabo Verde ; **iv.** La mise à jour de textes / règlement de pêche de la Gambie ; et **v.** le démarrage de l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie. En plus, l'élaboration du PAN –INN de la Mauritanie a démarré par l'analyse et le partage du cadre juridique ***(soit 2 PAN- INN et un taux d'avancement de 37,5 %)*.**

**R2.** La facilitation de la coopération entre les pays, les administrations et les organisations, avec un niveau de réalisation des extrants satisfaisant : **i.** la CSRP a organisé 5 Réunions du Groupe de Travail SCS (RGTSCS) pour l'évaluation et le partage des résultats de l'action ***(soit un taux de réalisation de + 100%) ;*** **ii.** le système de reporting et d'échange de données a été amélioré avec l'organisation de 6 ateliers techniques nationaux de saisie des données ***(soit un taux de réalisation de 85,71 %)*** ; **iii.** Dix-sept (17) cadres SCS des 7 EM ont été impliqués à l'évaluation et la mise à jour régulière des risques de pêche INN ***(soit un taux d'avancement de 50%)*** ; **iv**. Deux (2) ateliers nationaux interministériels ont été organisés en Gambie et au Sénégal pour une meilleure synergie des structures nationales parties prenantes au SCS ***(soit un taux d'avancement de 28, 57%),*** et **v.** la CSRP a signé deux (2) protocoles d'accord pour renforcer sa coopération avec d'autres organisations impliquées dans la lutte contre la pêche INN ***(soit un taux d'avancement de 33,33%).*** En revanche, la convention SCS n'a pas été approuvée à cause des observations soulevées par certains EM. Toutefois, un projet de texte consensuel a été élaboré avec l'appui d'un consultant ***(soit un taux d'avancement de 40%).***

**R3.** L'amélioration de l'infrastructure et les équipements du Centre régional SCS et le lien avec les structures nationales SCS avec un excellent niveau de réalisation des extrants : **i.** un véhicule et une motocyclette ont été acquis pour assurer la mobilité du personnel du centre basé à Banjul ***(soit un taux de réalisation de 100%)*** ; **ii.** Onze (11) kits de visioconférence ont été installés pour améliorer la communication entre les structures SCS ***(soit un taux de réalisation de 100%)*** ; **iii.** un groupe électrogène et un système secouru d'électricité ont été acquis pour autonomiser le centre en électricité ***(soit un taux de réalisation de 100%).*** **iv.** les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals qui interviennent dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches ont été renforcées par l'acquisition de 8 téléphones satellitaires, 7 antennes et 8 téléphones smartphones robustes ***(soit un taux de réalisation de +100%)*** ; et **v.** un lot de 108 tenues et équipements SCS a été remis aux inspecteurs des pêches de 6 EM ***(soit un taux de réalisation de 85,71%.)***. En revanche, le système VMS/ AIS n'a pas été acquis à cause de la non signature de la convention SCS ***(soit un taux de réalisation de 0%)***.

**R4**. Renforcement des capacités du personnel SCS des EM avec un excellent taux de réalisation : **i.** Neuf (9) ateliers nationaux de renforcement des capacités techniques de 236 inspecteurs des pêches, dont 27 femmes (+11%), ont été réalisés sur les techniques de contrôle et d'inspection des navires de pêche ***(soit un taux de réalisation de +100%)*** ; **ii.** 4 ateliers nationaux de formation sur l'utilisation des systèmes VMS/AIS et satellitaires en Gambie, Guinée, Mauritanie et Sierra Léone au profit de 29 opérateurs, dont 5 femmes et 32 inspecteurs des pêches ont été réalisées ; et un atelier sous régional de formation des formateurs a été organisée au profit de 2 inspecteurs et 8 expert SCS, dont une femme, de la CSRP et du CPCO à Lomé – Togo ***(soit un taux de réalisation de +100%)*** ; et **iii.** une conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences entre acteurs a été organisée sur la problématique de la pêche INN ***(soit un taux de réalisation de 100%).*** Par contre, aucun atelier national de formation d'observateurs n'a été réalisé au niveau des EM à cause de la non-approbation de la convention SCS (***soit un taux de réalisation de 0%).*** Egalement, aucun atelier sous régional n'a été réalisé au profit du personnel de la justice ***(soit un taux de réalisation de 0%)***.

**R5**. Missions de patrouille régionales conjointes dans la zone CSRP avec un excellent taux de réalisation. Au total 14 opérations ont été organisées ***(soit un taux de réalisation de 100%)*** et ont permis d'inspecter 707 navires et d'en arraisonner 85. Sur les 85 navires arraisonnés, les 20 battent le pavillon sénégalais, les 17 le pavillon chinois, les 13 le pavillon guinéen, les 12 le pavillon mauritanien, les 11 le pavillon cap verdien, les 3 le pavillon turc, les autres 3 le pavillon gambien, les 2 le pavillon ghanéen, l'un bat le pavillon camerounais et un autre le pavillon espagnol. En outre, l'identification des 85 motifs d'infractions en fonction de la définition de la pêche INN par le plan international de la FAO donne 71 infractions liées à la pêche illicite (84%), 14 infractions liées à la pêche non déclarée (16%) et aucune infraction n'est liée à la pêche non réglementée. La réalisation des extrants de l'action a mobilisé 1101 participants, dont 120 femmes **(10,90%)**, sur les 1 138 qui ont été initialement ciblés **(soit un taux de mobilisation de 96,75%)**.

Par contre, il faut signaler qu'aucun extrant relatif au résultat **R6.** « L'établissement d'un réseau d'observateurs régionaux pour améliorer la surveillance de la flotte industrielle active dans la région » n'a été réalisé. Il s'agit de : **i.** recrutement d'un Expert SCS pour assurer la coordination du registre sous régional des navires de pêche et du programme des observateurs à compétence sous régionale ; **ii.** l'organisation d'une réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs regroupant les parties prenantes concernées par le programme ; **iii.** la sélection de 30 observateurs nationaux pour composer le programme des observateurs à compétence sous régionale ; et **iv.** l'organisation d'un atelier sous régional pour renforcer les capacités des 30 observateurs nationaux du programme des observateurs à compétence sous régionale.

Dans le cadre de la réalisation des extrants, 61 marchés ont été attribués suivant les règles légales d'acquisition, pour un montant de 251 049 Euros (soit 164 679 853 FCFA). Aucun marché d'un montant supérieur à 60 000 EUR n'a été attribué. Les 61 marchés comprennent 34 (56%) Demandes de cotation, 14 (23%) Achats Directs, 8 (13%) Contrats cadres, 4 (6%) Sélections de consultants individuels et 1 (2%) Entente directe). Tous les 61 marchés attribués ont été exécutés et clôturés.

La CSRP, coordonnateur de l'Action, assure le suivi et l'évaluation des activités avec l'appui des EM (RGTSCS), la DUE – Dakar, la CEDEAO et l'AECP. A cet effet, des questionnaires de collecte de feedback ont été envoyés aux EM. Des réunions tripartites (DUE-Dakar, AECP et CSRP) ont été organisées pour apprécier l'état d'avancement des livrables et si nécessaire, recadrer la mise en œuvre de l'Action. La CEDEAO a organisé des réunions du comité de pilotage pour apprécier le niveau de mise en œuvre des trois composantes du PESCAO et a effectué des missions de « haut niveau » au niveau de la CSRP pour évaluer les progrès de l'Action. L'AECP a organisé chaque année une réunion du comité de pilotage pour partager les réalisations de l'année écoulée et planifier les activités de l'année en cours. La DUE – Dakar a commandité un audit financier de l'année 1 de l'Action et un audit ROM pour apprécier les résultats du PESCAO ; elle a aussi commandité une évaluation à mi-parcours de l'Action.

La mise en œuvre de l'Action a connu deux modifications majeures relatives à la durée du projet et à sa logique d'intervention : **1.** A la suite des retards causés par la pandémie de la Covid-19, la CSRP a sollicité et obtenu de la DUE – Dakar une prorogation de douze (12) mois de l'Action, à travers l'avenant N° 1 au Contrat de subvention N° FED / 2018 / 392 – 671. C'est pourquoi, la date de fin de l'Action a été prolongée jusqu'au 30 avril 2023 ; **2.** Pour des raisons liées à une instabilité politique en Gambie et en Guinée Bissau, le nombre des opérations conjointes de surveillance de type B (qui implique la Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal) a été réduit à deux (2), au lieu de quatre (4) opérations initialement prévues, et ont été remplacées par l'organisation de deux (02) opérations de type C couvrant les ZEE de la zone Nord de la CSRP

Au regard de ce qui précède, les 3 recommandations suivantes ont été formulées : **1.** Finaliser les activités restantes de l'Action (Plan d'action de lutte contre la pêche INN de la Mauritanie ; préparation et mise en place d'un système VMS et AIS du centre régional SCS ; poursuit de l'opérationnalisation du registre sous régional des pêches ; accompagnement de la mise en œuvre de l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures de l'Etat du port ; accompagner la mise en place du programme d'observateurs sous régionaux ; etc.) ; **2.** Consolider les acquis de cette action (continuer l'organisation d'opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches ; continuer les sessions de renforcement des capacités du personnel SCS avec l'AECP, etc.) ; et **3.** Etendre le domaine de l'action : **i.** à la pêche artisanale ; **ii.** à la recherche ; **iii.** à la préservation des écosystèmes ; et **iv.** aux effets du changement climatique.

Pour finir, il serait important de souligner que la 21e session ordinaire de la Conférence, présidée par le Ministre de la pêche et de l'économie maritime du Sénégal, a été organisée en présence des 7 Ministre des Etats membres. Conformément à la Convention portant création d'une Commission Sous Régionale des Pêches, la Présidence de la CSRP est revenue à la Gambie et le Secrétariat Permanent est assuré par la Mauritanie. A cet effet, **Son Excellence M. Musa S. DRAMMEH**, Ministre de la Pêche, des ressources en eaux et des Affaires de l'Assemblée de la Gambie est Président de la Conférence des Ministres **et Dr Khallahi BRAHIM** est désigné par la Mauritanie comme Secrétaire Permanant de la CSRP.

### 1.9. Résultats et activités

## A. RESULTATS

Du 03 mai 2018 au 30 avril 2023, la CSRP a mis en œuvre l'Action, avec le soutien technique de l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP) et la supervision et le suivi de la DUE –Dakar et de la CEDEAO, pour un coût global de 3 625 000 Euros. Les extrants réalisés au niveau des Etats Membres (EM) de la CSRP ont été jugés très efficaces et satisfaisants. Ils concernent principalement l'alignement des cadres juridiques des EM avec les normes internationales, le renforcement des capacités des structures en charge du Suivi, du Contrôle et la Surveillance (SCS) des pêches et la mutualisation des moyens techniques et matériels afin de lutter efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les progrès enregistrés ont contribué à l'atteinte de 5 résultats. Il s'agit de :

- **R.1** : les cadres juridiques des pêches sont harmonisés et conformes aux normes internationales pour assurer une lutte adéquate contre la pêche INN ;
- **R.2** : la coopération entre les pays, les administrations et les organisations est facilitée ;
- **R.3** : l'infrastructure et les équipements du Centre régional pour le suivi, le contrôle et la surveillance ainsi que le lien avec les structures nationales SCS sont améliorés ;
- **R.4** : les capacités des pays et des ORP en matière de suivi, de contrôle et de surveillance opérationnels sont renforcées, tout comme leur capacité à assurer une viabilité à long terme grâce à de meilleurs programmes de formation ; et
- **R.5** : des missions de patrouille sous régionales conjointes (maritimes et aériennes) sont organisées dans la zone CSRP ;
- En revanche, aucun progrès majeur n'a été enregistré concernant le résultat **R6.** « l'établissement d'un réseau d'observateurs régionaux pour améliorer la surveillance de la flotte industrielle active dans la région ».

Dans le cadre de l'harmonisation des cadres juridiques des pêches en conformité aux normes internationales de lutte contre la pêche INN, **le niveau de réalisation des livrables est jugé satisfaisant**. Dans un premier temps, les EM de la CSRP ont bénéficié de 5 missions d'assistances techniques de l'AECP pour mettre à niveau et aligner leurs cadres juridiques et outils de lutte contre la pêche INN suivant les conventions et instruments internationaux **(soit un taux de réalisation de 71, 43%)**. Il s'agit de : **i.** l'examen et l'analyse du cadre juridique des pays de la CSRP et du CPCO sur la pêche INN pour identifier les lacunes et connaître l'appui nécessaire ; **ii.** l'élaboration d'un Projet de décret-loi sur la pêche du Cabo Verde ; **iii.** la révision et de la mise à jour du Plan d'action nationale de lutte contre la pêche INN (PAN-INN) du Cabo Verde ; **iv**. la mise à jour de textes / règlement de pêche de la Gambie ; et **v.** le démarrage de l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie. Dans un deuxième temps, pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN en Afrique de l'Ouest, le plan d'action nationale du Cabo Verde a été actualisé et l'élaboration du PAN –INN de la Mauritanie a démarré par l'analyse préliminaire du cadre juridique **(soit un taux d'avancement de 37,5 %).**

Aucune activité n'a été menée pour promouvoir la ratification de l'Accord sur les mesures du ressort de l'Etat du port par la Guinée Bissau **(soit un taux d'avancement de 0%).**

Concernant la facilitation de la coopération entre les pays, les administrations et les organisations, **le niveau de réalisation des extrants a été également jugé satisfaisant**. Les résultats obtenus sont relatifs à :**1.** l'organisation, par la CSRP de cinq (05) Réunions du Groupe de Travail SCS **(RGTSCS),** au lieu de quatre (04) initialement prévues**,** pour l'évaluation et le partage des résultats de l'Action **(soit un taux de réalisation de + 100%) ; 2.** la tenue de six (06) ateliers techniques nationaux de saisie des données **(soit un taux de réalisation de 85,71 %)** dans le cadre de la mise en place d'un système de

reporting et d'échange de données ; **3.** la formation de 17 cadres SCS des 7 EM de la CSRP à l'évaluation et la mise à jour régulière des risques de pêche INN **(soit un taux d'avancement de 50%)** ; **4.** l'organisation de deux (02) ateliers nationaux interministériels au niveau de la Gambie et du Sénégal pour créer une meilleure synergie entre les structures nationales parties prenantes au SCS **(soit un taux d'avancement de 28, 57%)** ; et **5.** la signature par la CSRP de deux (02) protocoles d'accord visant à renforcer la coopération avec d'autres organisations impliquées dans la lutte contre la pêche INN. Il s'agit, d'une part, du protocole d'accord signé avec l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches, le Comité des Pêches pour le Centre-ouest du Golfe de Guinée et l'Académie Régionale des Sciences et des Techniques de la Mer - Institut de Sécurité Maritime Interrégional, et d'autre part, de celui signé avec la CEDEAO et le CPCO **(soit un taux d'avancement de 33,33%).**

La convention SCS n'a pas été signée à cause des observations qui ont été soulevées par certains EM. Toutefois, un projet de texte consensuel a été élaboré avec l'appui d'un consultant **(soit un taux d'avancement de 40%).**

Quant à l'amélioration de l'infrastructure et les équipements du Centre régional pour le suivi, le contrôle et la surveillance, ainsi que le lien avec les structures nationales SCS, **le niveau de réalisation des extrants a été jugé excellent.** D'abord, un véhicule et une motocyclette ont été acquis pour assurer la mobilité du personnel du centre opérationnel de Banjul **(soit un taux de réalisation de 100%)**. Ensuite, pour améliorer la communication entre les structures SCS, onze (11) kits de visioconférence ont été installés au niveau des Etats membres, du DSCSA/UCOS à Banjul et du siège de la CSRP à Dakar **(soit un taux de réalisation de 100%)**. Egalement, un groupe électrogène et un système de secours d'électricité ont été acquis pour autonomiser le DSCSA/UCOS en électricité **(soit un taux de réalisation de 100%)**. Aussi, les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals qui interviennent dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches ont été renforcées par l'acquisition de huit (8) téléphones satellitaires, sept (7) antennes et huit (8) téléphones smartphones robustes **(soit un taux de réalisation de +100%)**. Enfin, un lot de cent huit (108) tenues et équipements SCS a été remis aux inspecteurs des pêches de six (6) États membres **(soit un taux de réalisation de 85,71%.)**.

Concernant le renforcement des capacités du personnel des structures SCS des pays et des ORP en matière de suivi, de contrôle et de surveillance opérationnels des pêches, **le niveau de réalisation des extrants a été aussi jugé excellent**. Avec l'appui technique de l'AECP, la CSRP a réalisé neuf (9) ateliers nationaux pour renforcer les capacités techniques de 236 inspecteurs des pêches, dont vingt-sept (**27)** femmes (+11%), sur les techniques de contrôle et d'inspection des navires de pêche **(soit un taux de réalisation de +100%)**. De plus, quatre (4) ateliers nationaux de formation au profit de vingt-neuf (29) opérateurs, dont cinq (5) femmes, et trente-deux (32) inspecteurs des pêches ont été réalisés sur l'utilisation des systèmes VMS/AIS et satellitaires en Gambie, Guinée, Mauritanie et Sierra Léone. Par ailleurs, un atelier sous régional de formation des formateurs de la zone CSRP et CPCO a été organisé à Lomé – Togo au profit de deux (2) inspecteurs et de huit (8) experts SCS, dont une femme **(soit un taux de réalisation de +100%).** Enfin, une conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences entre acteurs a été organisée sur la problématique de la pêche INN **(soit un taux de réalisation de 100%).**

Aucun atelier national de formation d'observateurs n'a été réalisé au niveau des Etats membres à cause de la non-signature de la convention SCS ***(soit un taux de réalisation de 0%)***. Egalement, aucun atelier sous régional n'a été réalisé au profit du personnel de la justice ***(Soit un taux de réalisation de 0%).*** Pour rappel, la non signature de la Convention est due aux réserves émises par la Mauritanie et la Guinée sur le document. Cependant, un projet de convention consensuel a été élaboré avec l'appui d'un consultant.

Pour les missions de patrouille régionales conjointes dans la zone CSRP, **le niveau de réalisation des extrants a été aussi jugé excellent**. Au total quatorze (14) opérations ont été organisées **(soit un taux de réalisation de 100%)** et ont permis d'inspecter sept cent sept (707) navires et d'en arraisonner

quatre-vingt-cinq (85). L'identification des infractions en fonction de la définition de la pêche INN dans le plan d'action international de la FAO a permis de les répartir en soixante-onze (71) infractions *(soit un taux de 84%)* **liées à la pêche illicite**, quatorze (14) infractions (*soit un taux de 16%)* **liées à la pêche non déclarée** et zéro (0) infraction *(soit un taux de 0%)* **relative à la pêche non déclarée**.

Il faut signaler qu'aucun extrant relatif au **résultat R6**. « l'établissement d'un réseau d'observateurs régionaux pour améliorer la surveillance de la flotte industrielle active dans la région» n'a été réalisé à cause de la non signature de la convention SCS. Il s'agit de : **i.** recrutement d'un Expert SCS pour assurer la coordination du registre sous régional des navires de pêche et du programme des observateurs à compétence sous régionale ; **ii.** l'organisation d'une réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs regroupant les parties prenantes concernées par le programme ; **iii.** la sélection de 30 observateurs nationaux pour composer le programme des observateurs à compétence sous régionale ; et iv. l'organisation d'un atelier sous régional pour renforcer les capacités des 30 observateurs nationaux du programme des observateurs à compétence sous régionale.

Par ailleurs, il faut noter que la réalisation des extrants de l'action a mobilisé mille cent un (1101) participants, dont cent vingt (120) femmes (10,90%), sur les mille cent trente-huit (1 138) qui ont été initialement ciblés **(soit un taux de mobilisation de 96,75%).**

Les tableaux 2 et 3, ci-dessous, présentent respectivement les détails des groupes cibles mobilisés et la synthèse des extrants, des activités planifiées et de leurs états d'avancement.

**Tableau n° 2 : Groupes cibles mobilisés dans la mise en œuvre de l'action :**

| Groupes cibles | | Nbre ciblés | Nombre mobilisé par année | | | | | | | | | | Nombre mobilisé depuis le lancement | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année 1 | | Année 2 | | Année 3 | | Année 4 | | Année 5 | | Nombre | | % |
| | | | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | |
| Ministres et/ou Représentants | | 7 | **5** | | 2 | 00 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | **Plus de 100%** |
| GTSCS | | 7 | 14 | 00 | 16 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 | 26 | 5 | 83 | 10 | **Plus de 100%** |
| Cadres SCS | | 301 | 73 | 03 | 78 | 14 | 38 | 12 | 69 | 6 | 87 | 16 | 345 | 51 | **Plus de 100%** |
| Inspecteurs des pêches | Embarqués | 215 | 12 | 00 | 12 | 00 | 6 | 00 | 20 | 00 | 11 | 00 | 61 | 00 | **28,37%** |
| | Formés | | 20 | 01 | 17 | 5 | 19 | 2 | 85 | 14 | 68 | 5 | 209 | 27 | **Plus de 100%** |
| Opérateurs VMS/Radio | | 96 | 58 | 00 | 33 | 3 | 35 | 4 | 73 | 5 | 62 | 6 | 261 | 18 | **Plus de 100%** |
| Observateurs des pêches | Embarqués | 498 | 00 | | 02 | | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | **0,40%** |
| | Formés | | 00 | | 00 | | 00 | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | **00** |
| Juristes | | 14 | 03 | 05 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2 | 00 | 5 | 6 | **78,57%** |
| TOTAL | | 1138 | 185 | 09<br>4,6% | 160 | 25<br>13,5% | 115 | 22<br>16,1 | 264 | 30<br>10,2% | 257 | 34<br>11,7% | 981 | 120<br>10,9% | 96,75% |

**Remarques :**

Au regard du tableau, il est noté ce qui suit :

- ✓ Pour 5 groupes cibles, le nombre de participants enregistré pendant la mise en œuvre de l'action a largement dépassé le nombre qui a été ciblé (+100%). Il s'agit de la participation des Ministres et/ ou leurs représentants, des membres du GTSCS, des cadres SCS, u nombre d'inspecteurs formés et du nombre d'opérateurs VMS/radio ;
- ✓ La cible « juristes » a été mobilisée à 78, 57% ; et
- ✓ Aucun observateur des pêches n'a été formé et seulement 2 observateurs (0,40%) ont été embarqués pendant la deuxième année de l'action.

## Tableau n° 3 : Synthèse des extrants, des activités planifiées et de leurs états d'avancement

| ***R.1 : Les cadres juridiques des pêches sont harmonisés et conformes aux normes internationales pour assurer une lutte adéquate contre la pêche INN*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Extrants prévus** | **Principales activités planifiées** | **Principales activités réalisées** | **Indicateurs de suivi prévus** | **Taux de réalisation** |
| **Extr. 1.1 :** Appui de l'AECP pour l'examen et la mise à jour de lois/règlements nationaux conformément aux conventions et instruments internationaux dans le domaine de la pêche | A 1.1 : Examiner et mettre à jour les lois/règlements nationaux de pêche conformément aux conventions et instruments internationaux (y compris les ORGP) | 1 étude examinant et analysant le cadre juridique des pays de la CSRP et CPCO sur la pêche INN<br>Elaboration d'un Projet de décret-loi sur la pêche du Cabo Verde<br>Mise à jour de textes / règlement de pêche de la Gambie<br>Analyse préliminaire pour rédiger le PAN-INN de la Mauritanie<br>Assistance juridique pour la révision et mise à jour du PAN-INN du Cabo Verde | **07 missions d'assistance technique juridique au profit des EM** | 5 missions d'assistance technique ont été réalisées par l'AECP.<br>**Soit un taux de réalisation de 71, 43%** |
| **Extr. 1.2 :** 04 Plans d'action nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN | A 1.2 : Elaborer des plans d'action nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN sur requête des EM | Révision et mise à jour du PAN-INN du Cabo Verde<br>- Démarrage de l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie | **Au moins 4 Etats membres disposent de plans nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN** | **37,5%** |
| **Extr. 1.3 :** Promotion de la ratification par la Guinée Bissau et mise en œuvre de l'Accord sur les mesures du ressort de l'Etat du port | A 1.3 : Promouvoir la ratification et soutenir la mise en œuvre de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. | Néant | **Ratification de l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures du ressort par la Guinée Bissau** | **00%** |
| ***R.2 : La coopération entre les pays, les administrations et les organisations est facilitée*** | | | | |
| **Extrants prévus** | **Principales activités planifiées** | **Principales activités réalisées** | **Indicateurs de suivi prévus** | **Taux de réalisation** |
| **Extr. 2.1 :** Soutien de la mise en œuvre de la convention SCS et organisation de 04 réunions du GTSCS | A 2.1 : Opérationnaliser /développer des accords de coopération pour le suivi, le contrôle et la surveillance (droit de poursuite, échange d'informations, coordination des interventions, etc.). | Tenue, du 26 au 28 juin 2018, de la 1ère réunion du GTSCS élargie pour le lancement des activités du PESCAO,<br>Tenue, du 9 au 11 décembre 2019, de la 2ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan de l'an 1 et valider le PTA de l'an 2<br>Tenue, du 16 au 18 février 2021, au siège de la CSRP à Dakar - Sénégal, de la 3ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan des activités de l'an 2 et valider le PTA de l'an 4.<br>Tenue, du 06 au 08 juin 2022, de la 4ème réunion du GTSCS pour partager les résultats de l'année 4 de l'action et présenter la planification des activités de l'avenant N°1 au contrat de subvention N°FED/2018/392-671).<br>Tenue, 12 au 13 Avril 2023, de la 5ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan des activités de l'an 5 et discuter des perspectives après le projet | **Tenue des 04 réunions du GTSCS.** | **+ 100%** |
| | A 2.1' : Soutien de la mise en œuvre de la convention SCS | Elaboration d'un projet de texte consensuel qui intègre les réserves de la Guinée et de la Mauritanie | **Adoption de la Convention SCS** | **40%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Extr. 2.2 :** Développement et mise en œuvre d'un système de reporting et d'échange de données. | A 2.2 : Opérationnaliser le registre sous régional des navires de pêche | - Organisation, du 9 au 14 mars 2020, de l'atelier technique national de saisie des données de la Gambie. | **Organisation de 7 ateliers techniques nationaux de saisie des données du registre sous régional des navires de pêche** | **85,71 %** |
| | | Organisation, du 8 au 30 avril 2020, de l'atelier technique national de saisie des données du Sénégal. | | |
| | | Organisation, du 7 au 13 septembre 2020, de l'atelier technique national de saisie des données de la Guinée Bissau. | | |
| | | Organisation, du 16 au 21 novembre 2020, de l'atelier technique national de saisie des données du Cabo Verde. | | |
| | | Organisation, du 7 au 12 décembre 2020, de l'atelier technique national de saisie des données de la Sierra Léone. | | |
| | | Organisation, du 1er au 6 mars 2021, de l'atelier technique national de saisie des données de la République de Guinée. | | |
| | | - Amélioration du contenu et de fonctionnalité du registre sous régional des navires de pêche | **Existence de procédures / plateformes pour échanger des informations sur le SCS** | **100%** |
| **Extr. 2.3** : Participation aux ateliers de l'AECP sur la gestion des risques dans le cadre du SCS et planification des activités de SCS. | A 2.3 : Développer les renseignements, la gestion des risques et une meilleure planification stratégique du SCS (avec notamment des ateliers régionaux et le développement d'une catégorisation des risques, et un cadre d'évaluation et de gestion) | Participation de 17 cadres SCS à l'atelier sous régional sur l'évaluation des risques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) organisé par l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), les 26 et 27 novembre 2018 à Conakry en République de Guinée. | **Participation de 34 personnes des structures SCS des EM** | **50%** |
| **Extr. 2.4:** Organisation de 7 ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN pour la synergie des structures parties prenantes au SCS | **A 2.4 :** Etablir/renforcer la coopération inter agences et interministérielle au niveau national (notamment avec les ministres de la justice, les services des douanes, les autorités portuaires et la Marine) | Organisation d'un (1) atelier interministériel au niveau de la Gambie et du Sénégal. | **07 ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN pour développer la synergie des structures parties prenantes au SCS** | **28, 57%** |
| | | Organisation d'un (1) atelier interministériel au niveau du Sénégal. | | |
| **Extr. 2.5:** Elaboration de protocoles d'accord et d'échange d'expériences entre la CSRP et les partenaires comme CICTA, Interpol, ONUDC, Centre de gestion des ressources côtières et marines de la CEDEAO | **A 2.6 :** Renforcer la coopération avec d'autres organisations impliquées dans la lutte contre la pêche INN et d'autres activités criminelles (CICTA, Interpol, ONUDC, Centre de gestion des ressources côtières et marines de la CEDEAO, etc.). | Signature d'un protocole d'accord quadruple parties entre l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches, le Comité des Pêches pour le Centre-ouest du Golfe de Guinée, la Commission Sous Régionale des Pêches et l'Académie Régionale des Sciences et des Techniques de la Mer - Institut de Sécurité Maritime Interrégional | **06 conventions de partenariat de protocoles d'accord et d'échange d'expériences signés** | **33,33%** |
| | | Signature, le 08 avril 2022, d'un protocole d'accord, entre la CEDEAO, le CPCO et la CSRP, pour renforcer le lien institutionnel entre les trois parties | | |

| ***R.3 : l'infrastructure et les équipements du Centre régional pour le suivi, le contrôle et la surveillance ainsi que le lien avec les structures nationales SCS sont améliorés.*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Extrants prévus** | **Principales activités planifiées** | **Principales activités réalisées** | **Indicateurs de suivi prévus** | **Taux de réalisation** |
| **Extr. 3.1:** Acquisition d'un véhicule et d'une motocyclette pour assurer la mobilité du centre opérationnel de Banjul. | **A 3.1 :** doter l'unité de coordination SCS de la CSRP d'un véhicule et d'une motocyclette pour assurer la mobilité du centre opérationnel de Banjul. | 1 véhicule 1 mobylette sont acquis | **01 voiture et 1 mobylette sont disponibles au DSCSA/UCOS à Banjul** | **100%** |
| **Extr. 3.2:** Installation d'équipements de visioconférence au niveau de chaque Etat membre, de l'UCOS et de la CSRP (Dakar). | **A 3.2 :** Améliorer les services de télécommunication entre le centre des opérations des États membres et celui de l'unité de coordination SCS de la CSRP | 1 kit de visioconférence en Gambie (MCS Unit), installé le 20 septembre 2019<br>2 kits de visioconférence en Mauritanie (Nouakchott et Nouadhibou), installés le 16 octobre 2019<br>2 kits de visioconférence au Cabo Verde (Praia et Mindelo, installés le 30 décembre 2019 ;<br>1 kit de visioconférence au siège de la CSRP, installé le 16 septembre 2019.<br>1 Kit de visioconférence du Centre National de Surveillance et de police des Pêcheries (CNSP) de la Guinée installé le 11 mars 2019<br>1 Kit de visioconférence de la FISCAP de la Guinée Bissau installé le 16 avril 2019<br>1 Kit de visioconférence de l'UCOS/DSCSA/CSRP basée en Gambie installé le 30 avril 2019<br>1 Kit de visioconférence du MCS de la Sierra Léone installé le 06 mai 2019<br>1 Kit de visioconférence de la DPSP du Sénégal installé le 18 juillet 2019. | **11 kits de visioconférence au niveau des Etats membres, du DSCSA/UCOS à Banjul et du siège de la CSRP à Dakar** | **100%** |
| **Extr. 3.3:** Acquisition d'un VMS et d'un système d'identification automatique (AIS) | **A 3.3** : Doter l'unité de coordination SCS de la CSRP d'un système VMS régional et d'un système d'identification automatique (AIS) régional. | **Non réalisée** (activité liée à la signature de la convention SCS). | **01 VMS /AIS sous régional opérationnel** | **0%** |
| **Extr. 3.4:** Acquisition et installation d'un groupe électrogène et d'un système secouru d'électricité du DSCSA/UCOS | **A 3.4 :** Garantir un approvisionnement fiable en énergie électrique des installations régionales du DSCSA/UCOS. | - Acquisition et installation d'un groupe électrogène et d'un système secouru d'électricité du DSCSA/UCOS | **1 groupe électrogène et 1 système secouru d'électricité du DSCSA/UCOS** | **100%** |
| **Extr. 3.5:** Acquisition de 15 téléphones satellitaires pour renforcer les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals engagés dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches | **A.3.5 :** Renforcer les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals engagés dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches | Acquisition de 8 téléphones satellitaires<br>Acquisition de 07 antennes téléphoniques satellitaires<br>Acquisition de 08 téléphones smartphones robustes | **15 téléphones satellitaires pour les salles opérations et les moyens navals des structures SCS des Etats membres** | **+ 100%** |
| Extr. 3.6: Acquisition de tenues et d'équipements SCS pour les inspecteurs des 7 Etats membres de la CSRP | **A 3.6 :** Acquisition de tenues et d'équipements SCS aux Inspecteurs des Etats membres de la CSRP | Acquisition le 15 Décembre 2020 de 108 tenues et équipements SCS aux inspecteurs des pêches de **6 États membres** de la CSRP, notamment le Sénégal, la Gambie, la Sierra Léone, la République de Guinée, le Cabo Verde et la Guinée Bissau | Les Inspecteurs des pêches des **7 Etats membres** de la CSRP dotés en tenues et équipements SCS | **85,71%** . |

| ***R.4 : les capacités des pays et des ORP en matière de suivi, de contrôle et de surveillance opérationnels sont renforcées, tout comme leur capacité à assurer une viabilité à long terme grâce à de meilleurs programmes de formation.*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Extrants prévus** | **Principales activités planifiées** | **Principales activités réalisées** | **Indicateurs de suivi prévus** | **Taux de réalisation** |
| **Extr. 4.1:** Organisation de 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches des Etats membres. | **A 4.1 :** Développer un tronc commun / un cadre de certification sectoriel basé plus particulièrement sur l'annexe E de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port de la FAO, afin de garantir la comparabilité des certifications des inspecteurs des pêches travaillant dans les sous-régions : | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), de l'atelier national de formation de 21 inspecteurs des pêches de la République de Guinée, du 12 au 14 mars 2019, à Conakry (Guinée) | **07 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches des Etats membres.** | **+ 100%** |
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), de l'atelier national de formation de 22 inspecteurs des pêches de la République de Gambie, du 18 au 20 septembre 2019 à Banjul | | |
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), de l'atelier national, virtuel, de formation de 21 inspecteurs des pêches de la Sierra Léone, du 14 au 17 décembre 2020 | | |
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), de deux **(2)** ateliers nationaux, virtuels, de formation de 40 inspecteurs des pêches du Cabo Verde, à Praia du 19 au 22 octobre 2021 et à Mindelo du 26 au 29 octobre | | |
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), de l'atelier national, virtuel, de formation de 19 inspecteurs des pêches du Sénégal, du 13 au 16 décembre 2021 | | |
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), de deux **(2)** ateliers nationaux, virtuels, de formation de 40 inspecteurs des pêches de la Mauritanie, à Nouadhibou du 07 au 09 février 2022 et à Nouakchott du 22 au 24 Février 2022 | | |
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), d'un atelier national de formation de 21 inspecteurs des pêches de la Guinée Bissau, du 09 au 12 mai 2022 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Co-organisation, la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP) et l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), d'un atelier national de formation de 17 inspecteurs des pêches de la Sierra Léone, du 03 au 06 Octobre 2022. | | |
| **Extr. 4.2:** Organisation de 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des observateurs des Etats membres. | .A 4.2 : Au besoin, en coopération avec les instituts de formation nationaux, organiser une formation nationale sur le terrain et des séances d'échange d'expériences à l'intention des inspecteurs nationaux des pêches (formation des formateurs et inspecteurs nationaux), des opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel des autres agences et ministères. | **Non réalisée** (activité liée à la signature de la convention SCS). | **07 ateliers nationaux de renforcement des capacités des observateurs des pêches des Etats membres.** | **0%** |
| **Extr. 4.3:** Organisation de 02 ateliers sous régionaux au profit du personnel de la justice. | **A 4.3 :** Organiser une formation régionale sur le terrain et des séances d'échanges d'expériences à l'intention du personnel des CSP travaillant dans les CSP sous régionaux, des procureurs/du personnel judiciaire, éventuellement en coopération avec le réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest (WACAP) et les programmes de sécurité maritime financés par l'Union européenne. | **Non réalisées** | **02 ateliers sous régionaux de sensibilisation au profit du personnel de la justice.** | **0%** |
| **Extr. 4.4:** Organisation d'une conférence internationale de sensibilisation, de partage d'expériences entre acteurs sur la problématique de la pêche INN. | **A 4.4 :** Organiser une formation spécifique et des séances d'échange d'expériences sur les systèmes de certification des captures adoptés par les ORGP et le règlement sur la pêche INN de l'Union européenne pour les agents chargés de vérifier et de valider les certificats de capture. | Organisation d'une conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN du 14 au 15 Avril 2023 à Dakar | **Tenue d'une (1) conférence internationale de sensibilisation, de partage d'expériences entre acteurs sur la problématique de la pêche INN** | **100%** |
| **Extr. 4.5 :** Au besoin, organisation de formations nationales sur le terrain et des séances d'échange d'expériences à l'intention des inspecteurs nationaux des pêches (formation des formateurs et inspecteurs nationaux), des opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel des autres agences et ministères. | **A 4.2 :** Au besoin, en coopération avec les instituts de formation nationaux, organiser des formations nationales sur le terrain et des séances d'échange d'expériences à l'intention des inspecteurs nationaux des pêches (formation des formateurs et inspecteurs nationaux), des opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel des autres agences et ministères. | Organisation de 4 ateliers nationaux de formation des opérateurs sur l'utilisation des systèmes VMS/AIS et satellitaires en Gambie, Guinée, Mauritanie et Sierra Léone.<br>Organisation par l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (AECP), d'un atelier sous régional de formation d'inspecteurs et des opérateurs de CSP formateurs de la CSRP et CPCO à Lomé - Togo | **Au moins 02 formations nationales sur le terrain** | **+100%** |

| ***R.5 : des missions de patrouille régionales conjointes sont organisées dans la zone CSRP des missions de patrouille régionales conjointes sont organisées dans la zone CSRP.*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Extrants prévus** | **Principales activités planifiées** | **Principales activités réalisées** | **Indicateurs de suivi prévus** | **Taux de réalisation** |
| **Extr. 5.1:** Organisation de 7 opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches de type A. | **A 5.1 :** Offrir un appui à l'organisation et à la mise en œuvre d'opérations SCS conjointes, y compris l'échange d'effectifs et de moyens, et assurer des séances d'information opérationnelles (régionales).<br><br>**A 5.2 :** Planifier et mener des opérations conjointes (aériennes et maritimes), y compris l'affrètement éventuel de navires/d'avions.<br><br>**A 5.3 :** rechercher des synergies avec les activités opérationnelles menées dans le cadre des programmes de sécurité maritime financés par l'Union (par ex. des exercices conjoints, l'échange d'informations, etc.). | L'opération « BADJIGUI KOUYATE » qui a couvert, du 28 novembre au 04 décembre 2018, les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone.<br>L'opération « KUTA » organisée, du 06 au 14 mai 2019, dans les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone.<br>**3** opérations de 5 jours regroupés en 01 de 15 jours, baptisée « STINGRAY », qui a couvert, du 18 avril au 02 mai 2021, les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone<br>L'opération « SEYDOUBA CAMARA », qui a couvert, du 18 au 26 novembre 2021, les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone<br>L'opération « BICA » organisée du 14 au 22 Mai 2022 dans les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone<br>Organisation d'une opération PESCAO/AFRICAN NEMO qui a impliquée, 06 au 17 Février 2023, le Cabo Verde, la Gambie et le Sénégal (A5) | **07 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type A (07 affrètements de patrouilleurs sous régionaux ; 07 appuis à la vedette de la Guinée Bissau ; 07 appui à la vedette de la Guinée et 07 appui à la vedette de la Sierra Léone)** | **+100%** |
| **Extr. 5.2:** Organisation de 2 opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches de type B. | | L'opération « MORY GNINGUE » organisée, du 16 au 23 septembre 2018, dans les zones économiques exclusives (ZEE) de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Sénégal ;<br>L'opération « TESSITO » qui a couvert, du 22 au 27 septembre 2019, les ZEE de la Gambie et de la Guinée Bissau et les zones Centre et Sud du Sénégal. | **02 opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches de type B (02 affrètements patrouilleur sous régional du Sénégal, 02 appuis vedette de la Guinée Bissau et 02 appuis vedette de la Gambie).** | **100%** |
| Extr. 5.3: Organisation de 5 opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches de type C. | | L'opération « ALEXANDRE BAPTISTA » qui s'est déroulée, du 1er au 04 février 2019, dans les ZEE du Cabo Verde, de la Mauritanie et du Sénégal ;<br>L'opération « SARDINELLE » qui a couvert, du 22 au 27 janvier 2020, les ZEE du Cabo Verde, de la Gambie et de la Mauritanie et du Sénégal ;<br>L'opération dénommée « SIZU », qui a couvert, du 25 au 29 août 2021, les ZEE du Cabo Verde, de la Gambie, de la Mauritanie et du Sénégal ;<br>**2** opérations de 5 jours regroupées en 01 de 10 jours, baptisées « CRE MOHAMED LEMINE LEFDHAL » qui a couvert, du 19 au 26 février 2022, les ZEE du Cabo Verde, de la Mauritanie et du Sénégal ; | **05 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type C sous régionales (03 appuis patrouilleurs du Cabo Verde ; 03 appui patrouilleur de la Mauritanie et 03 appuis patrouilleur du Sénégal)** | **100%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ***R.6 : un réseau d'observateurs régionaux est établi pour améliorer la surveillance de la flotte industrielle active dans la région.*** | | | | |
| **Extrants prévus** | **Principales activités planifiées** | **Principales activités réalisées** | **Indicateurs de suivi prévus** | **Taux de réalisation** |
| **Extr. 6.1:** Recrutement d'un Expert SCS pour assurer la coordination du registre sous régional des navires de pêche et du programme des observateurs à compétence sous régionale | **A 6.4** : assurer la coordination du programme des observateurs régionaux. | **Non réalisée** à cause de la non-approbation de la convention SCS). Toutefois, le dossier appel pour le recrutement a été diffusé et des dossiers de candidature ont été enregistrés | **01 Coordinateur du registre sous régional des navires de pêche et du programme des observateurs à compétence sous régionale** | **0%** |
| **Extr. 6.2:** Organisation d'une réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs regroupant les parties prenantes concernées par le programme (CSRP, Directions des pêches, structures SCS et centres de recherche des EM, armateurs, ICCAT et ORP). | **A 6.1 :** analyser les enseignements tirés des projets pilotes/études récentes et consulter les parties prenantes concernées (armateurs, CICTA, ORP, scientifiques et administrations nationales des pêches) pour concevoir un programme rentable et pratique. | **Non réalisée** (activité liée à la signature de la convention SCS). | **01 réunion internationale de partage d'expériences sur le programme des observateurs à compétence sous régionale** | **0%** |
| **Extr. 6.3 :** Sélection de 30 observateurs nationaux pour composer le programme des observateurs à compétence sous régionale. | **A 6.2 :** sélectionner des observateurs régionaux parmi les observateurs nationaux et les former. | **Non réalisée** (activité liée à la signature de la convention SCS). | **30 observateurs à compétence sous régionale** | **0%** |
| **Extr. 6.4. :** Organisation d'un atelier sous régional pour renforcer les capacités des 30 observateurs nationaux du programme des observateurs à compétence sous régionale. | **A 6.5 :** mettre au point des mécanismes pour un financement durable. | **Non réalisée** (activité liée à la signature de la convention SCS). | **01 atelier sous régional de renforcement des capacités des observateurs nationaux sélectionnés** | **0%** |
| | | | | |

## B. ACTIVITES

Pour réaliser les livrables de l'action, plusieurs activités ont été menées au niveau des EM avec l'appui technique des experts de l'AECP, la collaboration des structures de pêche et le suivi et la supervision de la CEDEAO et de la DUE – Dakar. La CSRP a aussi reçu deux missions commanditées par la DUE-Dakar et l'EU pour un audit Results Oriented Monitoring (ROM) et une évaluation à mi-parcours de l'action.

**A 1.1 : Examiner et mettre à jour les lois/règlements nationaux de pêche conformément aux conventions et instruments internationaux (y compris les ORGP).**

L'alignement aux conventions et outils internationaux de lutte contre la Pêche INN des cadres juridiques des EM de la CSRP a commencé par un examen et une analyse des lacunes des cadres juridiques par l'AECP. Ensuite, sur la base d'une demande, le Cabo Verde a été accompagné dans l'élaboration d'un projet de décret/ loi sur la pêche et l'actualisation de son Plan d'action national de lutte contre la pêche INN. Également, la loi 2007 sur la pêche et le règlement de pêche n° 2008-6 du 9 juin 2008 de la Gambie ont été actualisés pour une gestion durable des pêches. Enfin, l'analyse préliminaire du cadre juridique de la Mauritanie a été réalisée en ligne (à cause de la Covid 19), en vue de l'élaboration de son PAN – INN. En outre, la finalisation de l'élaboration du plan d'action fait partie des besoins prioritaires de la Mauritanie.

***Photo 1 :*** *Atelier de partage de l''analyse juridique Zone CSRP et CPCO à Dakar*

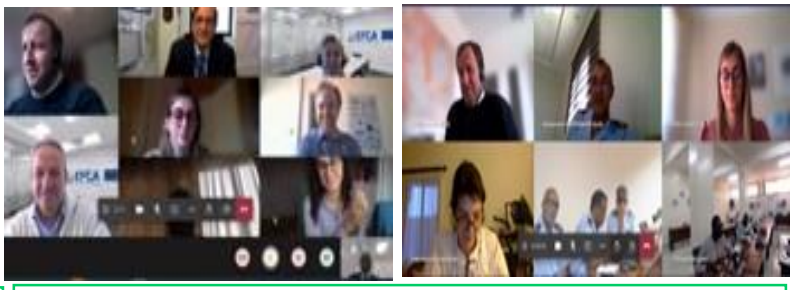

***Photos 2 :*** *Atelier virtuel de partage du rapport d'analyse préliminaire en vue de l'élaboration du PAN INN de la Mauritanie*

**A 1.2 : Elaborer 2 plans d'action nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN sur requête des EM.**

Les plans d'action sont d'importants outils pour éradiquer et contre carrer la pêche INN. C'est pourquoi, le Cabo Verde et la Mauritanie ont demandé à l'AECP un appui technique en ce sens. A cet effet, la révision et la mise à jour du plan d'action du Cabo Verde ont été réalisées. D'ailleurs, le processus est en cours pour la publication du document dans le journal officiel. Pour la Mauritanie, l'élaboration de son PAN-INN a démarré par la rédaction et le partage d'un rapport d'analyse préliminaire du cadre juridique.

**A 2.1 : Opérationnaliser /développer des accords de coopération pour le suivi, le contrôle et la surveillance.**

- **Organisation de RGTSCS**

Dans le but de faciliter la coopération et les échanges entre les pays, les administrations et les organisations pour une lutte contre la pêche INN plus efficace et efficiente, la CSRP a organisé les cinq (5) réunions du GT/SCS suivantes :

- ✓ 1ère réunion du GTSCS élargie pour le lancement des activités du PESCAO, tenue à Dakar du 26 au 28 juin 2018 ;
- ✓ 2ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan des activités de l'an 1 et valider le PTA de l'an 2, tenue du 9 au 11 décembre 2019 à Saly –Sénégal ;
- ✓ 3ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan des activités de l'an 2 et valider le PTA de l'an 4, tenue du 16 au 18 février 2021au siège de la CSRP à Dakar - Sénégal ;

- ✓ 4ème réunion du GTSCS pour partager les résultats de l'année 4 de l'action et présenter la planification des activités de l'avenant N°1 au contrat de subvention N°FED/2017/392-671), tenue du 06 au 08 juin 2022 à Saly au Sénégal ;
- ✓ 5ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan des activités de l'an 5 et discuter des perspectives, tenue du 12 au 13 Avril 2023 à Dakar.

Pour rappel, les réunions du GT/SCS constituent un cadre d'échanges entre les sept (7) Directeurs des pêches des 7 EM, qui sont de surcroit membres du Comité de Coordination, qui est l'organe technique consultatif de la Conférence des Ministres.

***Photos 3 :*** *Réunions du Groupe du travail SCS*

- **Soutien de la mise en œuvre de la Convention SCS**

Suite aux observations émises par certains membres sur le projet de Convention SCS, à la suite de l'accord de non objection de la Délégation de l'UE au Sénégal, la CSRP a acquis les services d'un expert juriste qui a proposé un projet de texte consensuel. Cependant, malgré des missions d'échanges effectuées par le Secrétaire Permanent sortant au niveau de certains EM comme la Guinée, le projet de texte proposé par le consultant n'a toujours pas été adopté.

***Photos 4 :*** *Echanges avec les autorités guinéennes en vue de de l'intégration de leurs observations dans le projet de convention*

## A 2.2 : Opérationnaliser le registre sous régional des navires de pêche.

Pour améliorer le contenu du registre sous régional des navires de pêche, la CSRP a réalisé les 6 ateliers techniques nationaux de saisie des données suivants :

- ✓ Du 9 au 14 mars 2020, l'atelier technique national de saisie des données de la Gambie ;
- ✓ Du 8 au 30 avril 2020, l'atelier technique national de saisie des données du Sénégal ;
- ✓ Du 7 au 13 septembre 2020, l'atelier technique national de saisie des données de la Guinée Bissau ;
- ✓ Du 16 au 21 novembre 2020, l'atelier technique national de saisie des données du Cabo Verde ;
- ✓ Du 7 au 12 décembre 2020, l'atelier technique national de saisie des données de la Sierra Léone ;
- ✓ Du 1er au 6 mars 2021, l'atelier technique national de saisie des données de la République de Guinée ;

En outre, pour améliorer la fonctionnalité du registre sous régional des pêches, la CSRP a fait appel aux services d'un expert pour intégrer, entre autres, la rapidité, l'affichage de la liste des navires et les paramètres de recherche avancée. La disponibilité d'une plateforme de données sur la pêche permet un partage d'informations entre les EM et une aide aux décideurs politiques à une prise de décisions éclairées.

***Photo 5 :*** *Présentation du registre sous régional des pêches par la Gambie*

***Photo 6 :*** *Saisie des données de Guinée Bissau dans le registre sous régional*

***Photo 7 :*** *Saisie des données de Sierra Léone*

**A 2.3 : Développer les renseignements, la gestion des risques et une meilleure planification stratégique du SCS.**

L'AECP a organisé avec l'appui de la CSRP, les 26 et 27 novembre 2018 à Conakry en République de Guinée, un atelier sous régional pour renforcer les capacités de 17 cadres SCS des EM sur l'évaluation des risques de pêche INN. L'activité a permis de mettre en place la première méthodologie sous régionale harmonisée d'évaluation des risques de pêche INN qui a été régulièrement évaluée et mise à jour par la CSRP avec le soutien de l'AECP.

**A 2.4 : Etablir/renforcer la coopération inter agences et interministérielle au niveau national.**

Pour créer une synergie et une meilleure coordination entre les structures nationales impliquées dans la lutte contre la pêche INN, deux (2) ateliers interministériels ont été organisés au niveau de la Gambie et du Sénégal. Les ateliers des cinq (5) autres EM de la CSRP qui étaient prévus dans l'Action n'ont pas pu se tenir avant la clôture de l'année 5 du PESCAO, pour des raisons de calendrier d'organisation à respecter par les pays.

**A 2. 5 : Renforcer la coopération avec d'autres organisations impliquées dans la lutte contre la pêche INN.**

Pour renforcer les capacités du personnel SCS des EM et ses liens entre d'autres institutions, la CSRP a signé les deux protocoles d'accord suivants :

- ✓ Le protocole d'accord multi parties entre l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches, le Comité des Pêches pour le Centre-ouest du Golfe de Guinée, la Commission Sous Régionale des Pêches et l'Académie Régionale des Sciences et des Techniques de la Mer - Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI). L'objectif de ce protocole d'accord est de permettre aux parties de participer à un programme de formation harmonisé à l'intention des personnels en charge du SCS en Afrique de l'Ouest ;

- ✓ Le protocole d'accord, entre la CEDEAO, le CPCO et la CSRP, dont l'objectif est de renforcer le lien institutionnel entre les trois parties en faveur de l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), particulièrement, l'Objectif de Développent Durable 14 (ODD 14) qui vise à « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ».

***Photos 8 :*** *Signature de protocole d'accord entre la CEDEAO, le CPCO et la CSRP, pour le renforcement du lien institutionnel entre les trois (03)*

***Photo 9 :*** *Formation du personnel SCS à l'ISMI -Abidjan*

**A 3.1 : Doter l'unité de coordination SCS de la CSRP d'un véhicule et d'une motocyclette pour assurer la mobilité du centre opérationnel de Banjul.**

Les moyens logistiques du personnel du Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l'Aménagement des Pêches (DSCSA) ont été améliorés par l'acquisition d'un véhicule et d'une mobylette.

**A 3.2 : Améliorer les services de télécommunication entre le centre des opérations des États membres et celui de l'unité de coordination SCS de la CSRP.**

La CSRP a acquis et installé onze (11) kits de visioconférence au niveau des structures SCS des 7 Etats membres et au niveau de la salle de conférence du Secrétariat permanent de la CSRP et du centre des opérations du Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l'Aménagement (DSCSA) des Pêches de la CSRP à Banjul. Il s'agit de :

- ✓ Un (1) kit de visioconférence en Gambie (MCS Unit), installé le 20 septembre 2019 ;
- ✓ Deux (2) kits de visioconférence en Mauritanie (Nouakchott et Nouadhibou), installés le 16 octobre 2019 ;
- ✓ Deux (2) kits de visioconférence au Cabo Verde (Praia et Mindelo), installés le 30 décembre 2019 ;
- ✓ Un (1) kit de visioconférence au siège de la CSRP, installé le 16 septembre 2019 ;
- ✓ Un (1) Kit de visioconférence du Centre National de Surveillance et de police des Pêcheries (CNSP) de la Guinée installé le 11 mars 2019 ;
- ✓ Un (1) Kit de visioconférence de la FISCAP de la Guinée Bissau installé le 16 avril 2019 ;
- ✓ Un (1) Kit de visioconférence de l'UCOS/DSCSA/CSRP basée en Gambie installé le 30 avril 2019 ;
- ✓ Un (1) Kit de visioconférence du MCS de la Sierra Léone installé le 06 mai 2019 ;
- ✓ Un (1) Kit de visioconférence de la DPSP du Sénégal installé le 18 juillet 2019.

Les visioconférences ont amélioré efficacement la communication entre les centres des opérations des structures SCS des Etats membres et le Poste Sous Régional de Coordination (PSRCO). Elles ont aussi contribué à renforcer le dispositif sous régional de collecte, d'analyse et de partage d'informations et de données sur la pêche INN. Par ailleurs, lors de la pandémie Covid 19, le dispositif a été utilisé pour le renforcement des capacités du personnel des structures SCS et pour faire l'analyse préliminaire du cadre juridique de la Mauritanie.

***Photos 10 :*** *Utilisation des vidéoconférences pour la formation du personnel SCS des Etats membres de la CSRP*

***Photo 11 :*** *Utilisation des vidéoconférences pour briefing des opérations*

**A .3.4 : Garantir un approvisionnement fiable en énergie électrique des installations régionales du DSCSA/UCOS.**

Pour pallier les coupures récurrentes de la fourniture d'électricité en Gambie, le Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l'Aménagement des Pêches (DSCSA) a été équipé d'un groupe électrogène.

**A.3. 5 : Renforcer les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals engagés dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches.**

La coordination des missions de contrôle et de surveillance sous régionales et nationales est devenue plus efficace et facile. La CSRP a acquis et remis aux structures SCS des EM huit (8) téléphones satellitaires, sept (7) antennes téléphoniques satellitaires et huit (8) téléphones smartphones robustes qui ont contribué à l'amélioration des communications entre, d'une part, le poste sous régional de coordination des opérations sous régionales conjointes des pêches et les moyens navals engagés ; et d'autre part, les moyens navals des EM et leurs salles d'opération SCS.

***Photos 13 :*** *Remise du téléphone robuste à Monsieur le Ministre, Président en exercice de la Conférence des Ministres*

***Photo 14 :*** *Modèle de téléphones Robustes (photo déchargée dans le net)*

**A 3. 6 : Acquisition de tenues et d'équipements SCS aux Inspecteurs des Etats membres de la CSRP.**

La CSRP a acquis et remis à l'exception de la République Islamique de Mauritanie, un lot de cent huit (108) tenues et d'équipements SCS aux inspecteurs des pêches des EM, notamment le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée Bissau, la République de Guinée, le Sénégal et la Sierra Léone.

***Photo 15 :*** *Inspecteur de la Gambie dotés en tenues et équipements*

***Photo 16 :*** *Inspecteur de la Sierra Léone dotés en tenues et équipements*

***Photo 17 :*** *Inspecteur du Sénégal dotés en tenues et équipements*

Il est important de souligner que l'acquisition d'un système VMS régional et d'un système d'identification automatique (AIS) régional pour l'unité de coordination SCS de la CSRP n'a pas été réalisée à cause de la non signature de la convention SCS.

**A 4.1 : Renforcer les capacités des inspecteurs des pêches et du personnel des Gardes Côtes.**

Pour renforcer les capacités de lutte contre la pêche INN des EM, la CSRP et l'AECP ont co-organisé neuf (9) ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches et du personnel des Gardes Côtes. Il s'agit de :

- ✓ L'atelier national de formation de 21 inspecteurs des pêches de la République de Guinée, du 12 au 14 mars 2019, à Conakry ;
- ✓ L'atelier national de formation de 22 inspecteurs des pêches de la République de Gambie, du 18 au 20 septembre 2019 à Banjul ;
- ✓ L'atelier national, virtuel, de formation de 21 inspecteurs des pêches de la Sierra Léone, du 14 au 17 décembre 2020 à Freetown ;
- ✓ Deux (2) ateliers nationaux, virtuels, de formation de 40 gardes côtes du Cabo Verde, à Praia du 19 au 22 octobre 2021 et à Mindelo du 26 au 29 octobre ;
- ✓ L'atelier national, virtuel, de formation de 19 inspecteurs des pêches du Sénégal, du 13 au 16 décembre 2021 ;
- ✓ Deux (2) ateliers nationaux, virtuels, de formation de 40 gardes côtes de la Mauritanie, à Nouadhibou du 07 au 09 février 2022 et à Nouakchott du 22 au 24 Février 2022 ;
- ✓ L'atelier national de formation de 21 inspecteurs des pêches de la Guinée Bissau, du 09 au 12 mai 2022 à Bissau ;
- ✓ L'atelier national de formation de 17 inspecteurs des pêches de la Sierra Léone, du 03 au 06 Octobre 2022.

Les 9 sessions de formations ont permis de renforcer les capacités de 236 Inspecteurs des pêches, dont 27 femmes, sur les techniques de contrôle et d'inspection des navires de pêche, s'appuyant sur le manuel de l'AECP *« Introduction à l'inspection de la pêche en mer des inspecteurs non-UE »*. Des personnes ressources qui ont été formées par l'AECP à Vigo ont supervisé l'application pratique des acquis des formations sur des navires. Les formations ont été d'une grande utilité et ont eu un impact très positif. Elles ont permis, d'une part, de mettre à jour les connaissances des inspecteurs des pêches et de les adapter aux nouvelles menaces de la pêche INN ; et d'autre part, d'améliorer substantiellement les performances et le travail d'inspection des navires, ainsi que la collecte et le traitement des données.

Il faut souligner que la formation au niveau national des observateurs des EM et les 2 ateliers sous régionaux au profit du personnel de la justice n'ont pas été réalisés à cause, respectivement, de la non signature de la convention SCS et de la non planification de l'activité par l'AECP.

***Photo 18 :*** *Formation des contrôleurs des pêches de la Mauritanie*

***Photo 19 :*** *Formation des Inspecteurs des pêches du Cabo Verde*

***Photo 20 :*** *Formation des Inspecteurs des pêches de la Gambie*

**A 4.2 : Organiser des séances d'échanges d'expérience sur la pêche INN.**

Une conférence internationale, regroupant plusieurs acteurs et institutions qui interviennent dans la gestion durable des pêches, a été organisée du 14 au 15 Avril 2023 à Dakar. La rencontre a permis de faire une sensibilisation et un partage d'expériences sur la pêche INN. Elle a aussi permis de faire l'évaluation finale des résultats de l'Action. Pour lutter plus efficacement contre la pêche INN en Afrique de l'Ouest, les participants de la conférence ont formulé les 26 recommandations suivantes :

1. Autoriser la CSRP à affréter les avions disponibles dans la sous-région ;
2. Alléger les procédures de demande d'autorisation d'organisation des opérations dans les ZEE des Etats membres (EM) et prévoir des autorisations annuelles pour tous les moyens affrétés par la CSRP dans le cadre des Opérations de surveillance (OPS) sous régionales ;
3. Simplifier les contrats d'affrètements à l'instar de ce qui s'est fait avec le PRAO ;
4. Poursuivre les efforts de formation des Inspecteurs, des Observateurs des pêches et des Opérateurs des Centres régionaux et nationaux ;
5. Mettre en place des mécanismes de partage de données et d'informations sur les activités de pêche ;
6. Echanger des expériences dans la planification et l'organisation des opérations conjointes de surveillance des pêches ;
7. Mieux prendre en compte la pêche artisanale dans les opérations conjointes de surveillance des pêches ;
8. Améliorer les législations en matière de pêche et veiller à ce qu'elles soient conformes aux instruments internationaux de lutte contre la pêche INN ;
9. Mettre en œuvre les instruments juridiques internationaux de gestion des pêches et de lutte contre la pêche INN ;
10. Renforcer la coopération et la coordination régionales en matière de lutte contre la pêche INN ;
11. Mettre en place un système d'informations fiable permettant une meilleure prise de décision ;
12. Renforcer les capacités nationales et régionales de mise en œuvre des instruments juridiques mondiaux ;
13. Réorienter certaines subventions de pêche vers la lutte contre la pêche INN ;
14. Promouvoir une plus grande transparence dans le secteur des pêches notamment dans l'attribution des autorisations de pêche, les déclarations, la liste des navires autorisés, etc. ;
15. Promouvoir la combinaison de différents outils dans les nouvelles stratégies de surveillance : moyens navals, aériens et satellitaires incluant les VMS ;
16. Promouvoir la transparence pour la gestion durable des pêches et pour renforcer l'efficacité des nouvelles technologies lesquelles ont besoin d'informations fiables pour être performantes ;
17. Fournir des efforts pour intégrer davantage la lutte contre la pêche Non Déclarée et la pêche Non réglementée dans les stratégies nationales et régionales de lutte contre la pêche INN ;
18. Exhorter les pays de la CSRP à mettre en œuvre les Standards de transparence tels que la FiTI et à publier le registre des navires de pêche autorisés ;
19. Renforcer les activités de SCS à terre afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des stratégies de lutte contre la pêche INN ;
20. Intégrer dans les instruments de coopération de lutte contre la pêche INN, des dispositions des instruments juridiques internationaux relatifs à la pêche maritime ;

**21.** Intégrer, dans les instruments de coopération de lutte contre la pêche INN, des principes et recommandations pertinents énoncés dans les instruments internationaux non contraignants relatifs à la pêche maritime ou d'intérêt pour la pêche maritime (Code de conduite pour une pêche responsable et les plans d'action internationaux subséquents, etc.) ;

**22.** Uniformiser, ou tout au moins harmoniser, les dispositions des lois et règlements relatifs à l'incrimination des faits qualifiés de pêche INN. Pour une coopération réussie en matière de police des pêches, les contractants doivent adopter les mêmes qualifications juridiques afférentes aux faits de pêche INN ;

**23.** Doter les EM/CSRP de capacités institutionnelles, humaines et techniques appropriées pour mener avec succès leurs opérations de surveillance des pêches ;

**24.** Capitaliser les acquis et s'approprier les résultats de la lutte contre la pêche INN obtenus dans le cadre du programme PESCAO ;

**25.** Renforcer le Suivi et Evaluation dans les dispositifs de SCS ; et

**26.** Identifier et mettre en œuvre des mécanismes de financement durable du système SCS des pêches dans la zone CSRP.

**A 4.3 : Renforcer les capacités des opérateurs des centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux et d'autres personnel SCS.**

L'AECP a organisé quatre (4) ateliers nationaux de formation de trente-deux (32) inspecteurs des pêches et vingt-neuf (29) opérateurs, dont cinq (5) femmes, au niveau de la Gambie, de la Guinée, de la Mauritanie et de la Sierra Léone. Les sessions ont permis de renforcer leurs capacités sur les systèmes VMS/AIS et l'analyse opérationnelle et l'interprétation des données issues de ces systèmes. Elles ont aussi permis une meilleure connaissance des cadres juridiques nationaux et internationaux ; et une meilleure connaissance et exploitation des sites qui abritent de grandes bases de données. Par ailleurs, l'AECP a partagé avec la CSRP et les structure SCS des Etats membres, en version française, anglaise et portugaise, le Manuel *« Cours pour les opérateurs des centres de surveillance des pêches sur les systèmes de suivi des navires - Pays non membres de l'UE ».*

L'AECP a aussi organisé à Lomé (Togo) un atelier sous régional de formation des formateurs de la CSRP et du CPCO. La formation a impliqué deux (2) inspecteurs et huit (8) experts SCS, dont une femme, des Etats membres de la CSRP.

***Photos 20 :*** *L'Expert de l'AECP formant 10 opérateurs du CSP de Guinée*

***Photo 21 :*** *Manuel des Cours remis à chaque*

**A 5.1 : Planifier et mener des opérations conjointes (aériennes et maritimes), y compris l'affrètement éventuel de navires/d'avions.**

La CSRP et l'AECP ont planifié et conduit quatorze (14) missions conjointes sous régionales de surveillance des pêches. Les 14 opérations comprennent sept (7) de type A (Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone), deux (2) de type B (Gambie, Guinée Bissau et Sénégal) et cinq (5) de type C (Cabo Verde, Mauritanie et Sénégal). En outre, dans le cadre d'une synergie d'action, l'opération PESCAO/AFRICAN NEMO a été organisée. Ainsi, les 15 opérations suivantes ont été réalisées :

- ✓ L'opération « BADJIGUI KOUYATE » qui a couvert, du 28 novembre au 04 décembre 2018, les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone ;

- ✓ L'opération « KUTA » organisée, du 06 au 14 mai 2019, dans les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone ;
- ✓ Trois (3) opérations de 5 jours regroupées en une (1) de 15 jours, baptisée « STINGRAY », qui a couvert, du 18 avril au 02 mai 2021, les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone ;
- ✓ L'opération « SEYDOUBA CAMARA », qui a couvert, du 18 au 26 novembre 2021, les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone ;
- ✓ L'opération « BICA » organisée du 14 au 22 Mai 2022 dans les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée et de la Sierra Léone ;
- ✓ L'opération PESCAO/AFRICAN NEMO qui a impliquée, du 06 au 17 Février 2023, le Cabo Verde, la Gambie et le Sénégal **;**
- ✓ L'opération « MORY GNINGUE » organisée, du 16 au 23 septembre 2018, dans les zones économiques exclusives (ZEE) de la Gambie, de la Guinée Bissau et du Sénégal ;
- ✓ L'opération « TESSITO » qui a couvert, du 22 au 27 septembre 2019, les ZEE de la Gambie et de la Guinée Bissau et les zones Centre et Sud du Sénégal ;
- ✓ L'opération « ALEXANDRE BAPTISTA » qui s'est déroulée, du 1er au 04 février 2019, dans les ZEE du Cabo Verde, de la Mauritanie et du Sénégal ;
- ✓ L'opération « SARDINELLE » qui a couvert, du 22 au 27 janvier 2020, les ZEE du Cabo Verde, de la Gambie et de la Mauritanie et du Sénégal ;
- ✓ L'opération dénommée « SIZU », qui a couvert, du 25 au 29 août 2021, les ZEE du Cabo Verde, de la Gambie, de la Mauritanie et du Sénégal ; et
- ✓ Deux (2) opérations de 5 jours regroupées en une (1) de 10 jours, baptisées « CRE MOHAMED LEMINE LEFDHAL » qui a couvert, du 19 au 26 février 2022, les ZEE du Cabo Verde, de la Mauritanie et du Sénégal ;

Chacune des opérations a été coordonnée par un Poste Sous Régional de Coordination (PSRCO). Tous les PSRCO ont été animés par les chargés des opérations des structures nationales SCS des Etats membres, un représentant du Patrouilleur de Haute Mer et un expert de l'Agence Européenne de Contrôle des Pêches (en présentiel ou en mode virtuel), sous la présidence du Chef du Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l'Aménagement des Pêches (DSCSA) de la CSRP.

Pour toutes les opérations, la CSRP a eu à soutenir financièrement le fonctionnement des moyens navals engagés par les Etats membres et à affréter un patrouilleur sous régional à bord duquel étaient toujours embarqués des inspecteurs des pêches des pays participants.

En outre, l'AECP a soutenu les quatorze (14) opérations avec les services maritimes intégrés (IMS) et l'imagerie de Copernicus qui, corrélés avec les VMS nationaux, ont permis au PSRCO de disposer en permanence d'informations en temps réel sur les activités de pêche dans la sous-région. Par ailleurs, il faut souligner que l'assistance de l'Agence de Contrôle des pêches comme fournisseur de données satellitaires sur le positionnement des navires de pêche dans les zones de surveillance ciblées pendant les opérations a été très apprécié par les Etats membres.

De plus, il faut souligner que certaines opérations ont bénéficié du soutien de moyens aériens affrétés par l'AECP ou mis gracieusement à la disposition de la CSRP par la Marine française basé à Dakar.

Les quatorze (14) opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches ont permis d'inspecter 707 navires de pêche et d'en arraisonner 85 **(voir en annexe 1 la liste de des navires arraisonnés)** pour diverses infractions. Le tableau n° 4 ci-dessous présente les résultats des opérations.

Tous les navires en activité de pêche INN ou soupçonnés de pratiques illicites dans la zone CSRP ont été signalés aux autorités nationales SCS des Etats membres aux fins d'une prise de mesures idoines, notamment l'application des dispositions de l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures du ressort de l'Etat du port. La même démarche a été également initiée au niveau des organisations régionales des pêches.

**Tableau n°4 : Synthèse des Résultats des 14 opérations de surveillances**

| Opération | Nombre navires détectés | Nombre navires identifiés | Nombre navires inspectés | Nombre navires arraisonnés |
|---|---|---|---|---|
| **« BADJIGUI KOUYATE »** | 79 | 59 | 47 | 3 |
| **« KUTA »** | 56 | 56 | 56 | 11 |
| **« STINGRAY »** | 228 | 149 | 71 | 12 |
| **SEYDOUBA CAMARA** | 203 | 92 | 70 | 6 |
| **« BICA »** | 91 | 57 | 45 | 3 |
| **« MORY GNINGUE »** | 119 | 63 | 42 | 6 |
| **« TESSITO »** | 203 | 118 | 69 | 8 |
| **« ALEXANDRE BAPTISTA »)** | 93 | 66 | 22 | 7 |
| **« SARDINELLE »)** | 89 | 67 | 67 | 11 |
| **« SIZU »** | 258 | 145 | 59 | 6 |
| **« CRE M, LEMINE LEFDHAL »** | 531 | 266 | 159 | 12 |
| **TOTAL** | **1950** | **1138** | **707** | **85** |
| | | | | |

**Remarques :**

L'analyse des résultats et du tableau en annexe1 relatif à la liste des navires arraisonnés, les pavillons, les motifs d'arraisonnement et les mesures prises, permet de noter ce qui suit :

- ✓ Sur les 707 navires inspectés, le taux des navires arraisonnés est de 12% (85 navires) ;
- ✓ Sur les 85 navires arraisonnés, les 20 battent le pavillon sénégalais, les 17 le pavillon chinois, les 13 le pavillon guinéen, les 12 le pavillon mauritanien, les 11 le pavillon Cap verdien, les 3 le pavillon turc, les autres 3 le pavillon gambien, les 2 le pavillon ghanéen, l'un bat le pavillon camerounais et un autre le pavillon espagnol **(voir figure n° 1)** ;
- ✓ L'identification des 85 motifs d'infraction en fonction de la définition de la pêche INN dans le plan international de la FAO donne 71 **infractions liées à la pêche illicite** (84%), **14 infractions liées à la pêche non déclarée** (16%) et aucune infraction n'est liée à **la pêche non réglementée**. **(Voir figure n° 2).**

**Figure n°1 : Pavillon des 85 navires arraisonnés**

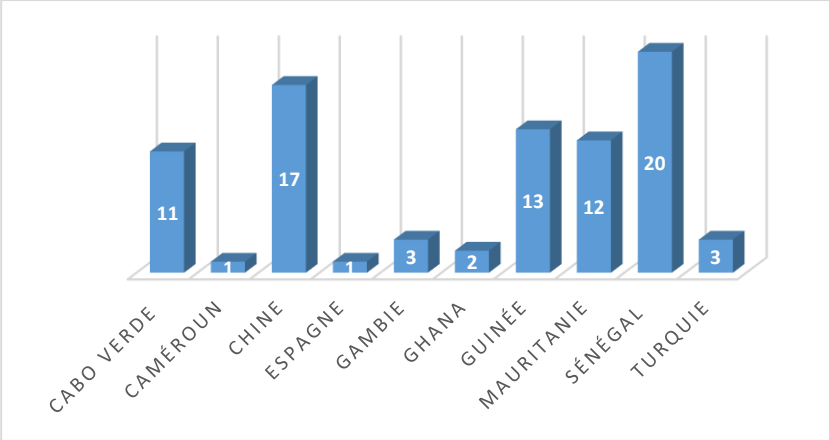

**Figure n°2 : Présentation des infractions en fonction de la définition de la pêche INN par le plan d'action international de la FAO**

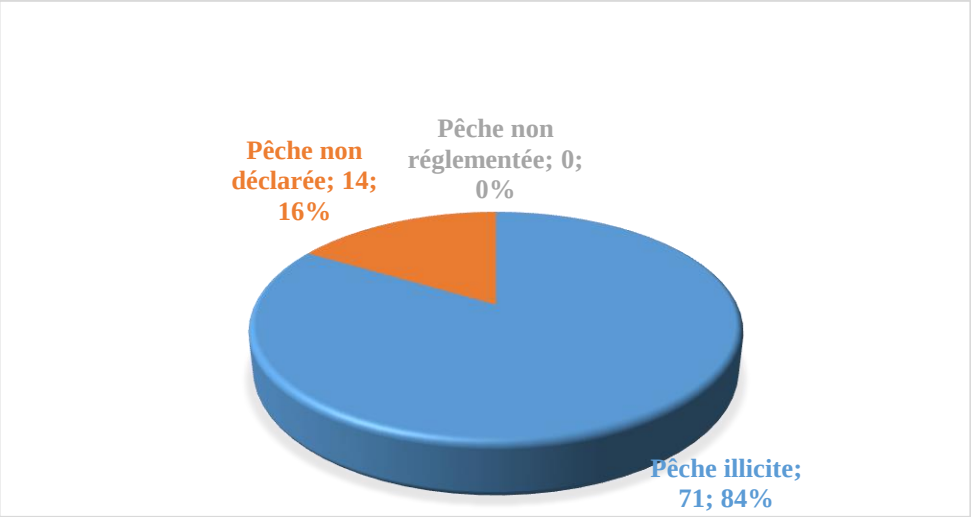


En plus des résultats du tableau et des diagrammes ci-dessus, les opérations ont aussi permis : **i.** la mutualisation des ressources humaines et opérationnelles ; **ii**. l'échange d'expérience SCS entre les membres d'équipage des patrouilleurs engagés dans les opérations ; **iii.** l'amélioration des compétences du personnel des Centres de Surveillance des Pêches (CSP), par l'expert de l'AECP, sur les systèmes VMS/AIS, l'analyse opérationnelle et l'interprétation des données ; **iv.** l'augmentation de l'expérience de la CSRP dans l'organisation d'opérations conjointes de surveillance sous régionale ; et **v.** le renforcement des capacités techniques et des structures SCS des Etats membres dans le contrôle de leur espace maritime.

***Photo 22 :*** *Image satellite AECP et Données des VMS des EM impliqués dans l'OPS CRE M. L. LEFDHAL*

***Photo 23 :*** *PSRCO opération SEYDOUBA CAMARAMA basé au CNSP de Guinée*

***Photo 24:*** *Briefing de operation CRE Mohamed. Lemine LEFDHAL*

**A 6 : Coordination du projet.**

La CSRP est le principal coordonnateur de l'action, sous la supervision et le suivi de la Due – Dakar et de la CEDEAO. La CSRP est appuyée dans la mise en œuvre de l'action par l'AECP et par le Groupe de Travail Suivi, Contrôle et Surveillance (GTSCS), composé par les directeurs des structures SCS des Etats membres. La CSRP a reçu aussi deux missions externes pour un audit ROM et une évaluation à mi-parcours de l'action. A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de l'action, la CSRP a organisé et / ou participé à diverses activités de pilotage en mode présentiel, virtuel ou par téléphone. Il s'agit de :

a) **Missions à Dakar pour la coordination de l'action :** Le Chef du Département Suivi, Contrôle et Surveillance de l'Aménagement des Pêches (DSCSA) basé à Banjul en Gambie assure la coordination du projet. A ce titre, il effectue régulièrement des missions sur Dakar pour des séances de travail avec les membres de l'équipe du projet. Les nouvelles technologies de l'information et de communication (visioconférence, WhatsApp, etc..) sont aussi utilisées.

b) **Réunions de coordination interne, p**our discuter des options de mise en œuvre et de la préparation des prochaines activités à réaliser ;

c) **Réunions du GTSCS :** La coordination du projet est appuyée par le Groupe de Travail Suivi, Contrôle et Surveillance (GTSCS) composé des directeurs des structures SCS des Etats membres. A la fin de chaque année de mise en œuvre des activités, une réunion du GTSCS a été organisée pour le partage des résultats de l'année écoulée et du plan d'action de l'année suivante.

d) **Réunions et échanges téléphoniques avec la DUE-Dakar**, pour avoir des orientations du service opérationnel et / ou financier de la Délégation, pour le partage d'informations et de l'état d'avancement de l'action, et pour le suivi du niveau d'exécution des activités ;

e) **Rencontres avec l'AECP,** pour discuter de la planification et des modalités de mise en œuvre d'activités ;

f) **Participation aux réunions du comité technique de l'AECP,** pour la présentation et l'examen des activités de l'année écoulée et discuter des activités de l'agence prévues au courant de l'année qui suit ;

g) **Participation aux réunions du Comité Régional de pilotage du PESCAO**, mis en place au niveau de la CEDEAO pour le suivi des 03 composantes du PESCAO ;

h) **Audit ROM**, commandité par la DUE – Dakar pour une évaluation de l'action axée sur les résultats ; et

i) **Réception d'une mission d'évaluation à mi-parcours du PESCAO**, commanditée par l'Union Européenne, pour évaluer les résultats de l'action.

**Recommandations**

Après lecture des extrants et des activités menées pour les réaliser, il est constaté que d'intéressants progrès ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. L'harmonisation des cadres juridiques et des instruments de lutte contre la pêche INN a été aussi amorcée. Même si la convention SCS n'a pas été approuvée, les capacités techniques et matériels du centre sous régional SCS et des centres de surveillance des pêches des EM ont été renforcées. Ainsi, il serait nécessaire de :

- ✓ Finaliser les activités restantes de l'action (Plan d'action de lutte contre la pêche INN de la Mauritanie ; préparation et mise en place d'un système VMS et AIS du centre régional SCS ; poursuite de l'opérationnalisation du registre sous régional des pêches ; accompagnement de la mise en œuvre de l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures de l'Etat du port ; accompagner la mise en place du programme d'observateurs sous régionaux ; etc.)

- ✓ Consolider et pérenniser les acquis de l'action (continuer l'organisation d'opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches ; continuer les sessions de renforcement des capacités du personnel SCS avec l'AECP ; etc.) ;

- ✓ Etendre le domaine de l'Action :
  - o à la pêche artisanale ;
  - o à la recherche ;
  - o à la préservation des écosystèmes ; et
  - o aux effets du changement climatique.

### 1.10. Utilisation des acquis et durabilité.

Les connaissances et moyens acquis durant la mise en œuvre de l'action sont utilisés différemment et certaines stratégies de pérennisation ont été adoptées.

Dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs des pêches, les connaissances acquises ont amélioré l'efficacité du travail des inspecteurs. Elles ont été appliquées sur le terrain à l'occasion des inspections de routine et des opérations de surveillance des pêches. Pour rendre durable l'activité, des personnes ressources ont été formées par l'AECP et un manuel ***« Introduction à l'inspection des pêches en mer et au port »*** a été remis à chaque inspecteur formé. En outre, les inspecteurs et les cadres SCS qui l'ont voulu ont été inscrits et ont accès à la plateforme de formation en ligne de l'agence.

Les acquis de la formation des opérateurs sont régulièrement utilisés dans les centre de surveillance des pêches pour l'analyse et l'interprétation de la cinématique des navires qui opèrent dans leurs ZEE. Les connaissances acquises aident aussi pour le recoupement des données et l'exploitation des sites qui hébergent de grandes bases de données sur la pêche. Comme la formation des inspecteurs, pour rendre durable l'activité, des personnes ressources ont été formées par l'AECP et un manuel des **« *Cours pour les opérateurs des centres de surveillance des pêches sur les systèmes de suivi des navires* - Pays non membres de l'UE »** a été remis à chaque inspecteur formé. En outre, les opérateurs et les cadres SCS qui l'ont voulu ont été inscrits et ont accès à la plateforme de formation en ligne de l'agence

Les vidéoconférences installées dans les structures de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) des pêches ont contribué à améliorer les communications intra et extra pays. Elles sont utilisées dans toutes les activités virtuelles qui impliquent le personnel des structures SCS, notamment pendant le briefing et le débriefing des opérations maritimes entre les États membres et les sessions de formations. L'entretien et la gestion du dispositif sont du ressort des EM.

## 2.4. Matrice-cadre logique mise à jour

| Chaîne de résultats | | Indicateurs | Point de référence | Valeur actuelle | Cibles (Années ) | | | | | Résultats attendus | Sources et moyens de vérification | Hypothèses de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Année de référence | Date de référence | A1 (2018 et 2019) | A2 (2019 et 2020) | A3 (2020 et 2021) | A4 (2021 et 2022) | A5 (2022 et 2023) | | | |
| | **Objectif général :** *Améliorer la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest par une meilleure coordination des politiques nationales de pêche* | | | | | | | | | | | |
| **Objectif(s) spécifique :** *Contribuer au renforcement de la prévention et des mesures de lutte contre la pêche INN par l'amélioration du Suivi, du Contrôle et de la Surveillance (SCS) aux niveaux national et régional* | La prévention et les réponses à la pêche INN sont renforcées grâce à un meilleur suivi, contrôle et surveillance | La pêche INN est réduite | 2016 | Estimée à 37 % des captures/ (1,5 milliard € en 2014) | | | | | | Réduction de 20% | Rapports Interpol et autres organisations internationales/régionales | -Volonté politique des États membres<br>- Volonté et engagement de la CSRP |
| **Résultat(s)** | R.1 : les cadres juridiques des pêches sont harmonisés et conformes aux normes internationales pour assurer une lutte adéquate contre la pêche INN | **In1 :** Nombre de pays disposant d'un plan d'action national de lutte contre la pêche INN et le mettant en œuvre de façon opérationnelle* | 2016 | 1 | | 0 | 0 | Démarrage de l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie | - Finalisation et partage du rapport de l'analyse préliminaire pour l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie<br><br>- Révision et mise à jour du PAN-INN du Cabo Verde | - 6 Plans nationaux INN adoptés dans l'ensemble des Etats membres | - Site de la FAO énumérant les plans d'action nationaux<br><br>- Rapports des projets | Participation effective des États membres au processus |
| | **R.2 :** la coopération entre les pays, les administrations et les organisations est facilitée. | **In2 :** Nombre de MoU, accords bilatéraux et multilatéraux établis | 2016 | 0 | 1 protocole d'accord CSRP-AECP-CPCO-ARSTM/ISMI | 0 | 0 | 1 protocole d'accord, entre la CEDEAO, le CPCO et la CSRP. | 0 | - 6 MoU, accords bilatéraux et multilatéraux signés<br>- | - Les textes des MoU, accords bilatéraux et multilatéraux | Coopération et collaboration des institutions régionales et des États membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **R.3 :** l'infrastructure et les équipements du Centre régional pour le suivi, le contrôle et la surveillance ainsi que le lien avec les structures nationales SCS sont améliorés. | **In3 :** Nombre de CSP équipés d'un système de visioconférence et de radio satellitaire et le Centre régional disposant d'un système VMS/AIS régional, d'électricité continue et de moyens logistique | 2016 | 0 | - 1 système secouru d'électricité<br>- 1 mobylette<br>- 5 visio-conférences<br>- 4 téléphones satellitaires | - 1 véhicule<br>- 6 visio-conférences<br>- 4 téléphones satellitaires | - 1 dispositif sécurité incendie bureaux équipe projet<br>- 1 dispositif vidéosurveillance bureaux équipe projet<br>- 1 système backup pour la visioconférence | - Existence d'un projet consensuel de convention SCS<br><br>- 8 téléphones smartphones robustes<br>- 7 antennes téléphones satellitaires | Etude et non adoption par la Conférence des Ministre du projet de convention SCS | - 1 VMS/AIS régional fonctionnel<br>- 1 système secouru d'électricité<br>- 1 véhicule<br>- 1 mobylette<br>- 11 visioconférences<br>- 15 téléphones satellitaires / smartphones + antennes<br><br>- | - Le registre de fonctionnement du VMS/AIS régional<br>- Les rapports de détection du VMS/AIS régional<br>- Les PV de réception et les registres de fonctionnement du système secouru d'électricité, du véhicule et de la mobylette | Volonté et engagement de la CSRP |
| | **R.4 :** les capacités des pays et des ORP en matière de suivi, de contrôle et de surveillance opérationnels sont renforcées, tout comme leur capacité à assurer une viabilité à long terme grâce à de meilleurs programmes de formation. | **In4 :** Nombre d'inspecteurs et d'observateurs des pêches formés (y compris des femmes) | | 0 (2017) | 21 inspecteurs des pêches dont 01 femme | - 22 inspecteurs des pêches dont 5 femmes | - 21 inspecteurs des pêches dont 2 femmes | - 99 inspecteurs des pêches dont 14 femmes | - 73 inspecteurs des pêches dont 5 femmes | - 70 inspecteurs des pêches dont 14 femmes<br><br>- 70 observateurs des pêches dont 7 femmes | - Les rapports des ateliers de formation<br><br>- Les attestations de réussite | - Disponibilité de l'EFCA<br><br>- Volonté et engagement des Etats membres |
| | | **In4 :** Nombre d'opérateurs des centres de surveillance des pêches formés (y compris des femmes) | | | | - 21 opérateurs dont 3 femmes des centres de surveillance des pêches | 0 | - 10 opérateurs dont 4 femmes des centres de surveillance des pêches | - 29 opérateurs dont 5 femmes des centres de surveillance des pêches | 27 opérateurs des centres de surveillance des pêches (y compris 2 femmes) | | |
| | **R.5 :** des missions de patrouille régionales conjointes sont organisées dans la zone CSRP | **In5 :** Nombre d'activités sous régionales de surveillance des pêches effectuées par des patrouilles | | 3 (2017) | 04 opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches | - 02 opérations conjointes sous régionales des pêches | - 03 opérations conjointes sous régionales des pêches | - 04 opérations conjointes sous régionales des pêches | - 02 opérations conjointes sous régionales des pêches | 14 missions conjointes de patrouille sous régionales | Les rapports techniques et financiers des missions conjointes de patrouille sous régionales. | Volonté et engagement des Etats membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **R.6 :** un réseau d'observateurs régionaux est établi pour améliorer la surveillance de la flotte industrielle active dans la région. | **In6 :** Nombre d'observateurs sous régionaux embarqués | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 observateurs sous régionaux | - Les fiches d'embarquement des observateurs<br><br>- Les rapports de marée des observateurs | Volonté et engagement des Etats membres |
| **Extrants** | | | | | | | | | | | | |
| **Extrants liés au Résultat 1 :** | **Extr. 1.1 :** Appui à l'AECP pour l'examen et à la mise à jour lois/règlements nationaux conformément aux conventions et instruments internationaux dans le domaine de la pêche | 01 étude examinant et analysant le cadre juridique des pays de la CSRP et CPCO sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée | 2016 | 0 | 1 étude examinant et analysant le cadre juridique des pays de la CSRP et CPCO sur la pêche INN | - 1 projet de décret-loi sur la pêche du Cabo Verde | 0 | - 1 Mise à jour de textes / règlements de pêche de la Gambie ;<br><br>- 1 Analyse préliminaire pour rédiger le Plan d'Action Nationale de lutte contre la pêche INN (PAN-INN) de la Mauritanie | - 1 Finalisation de l'analyse préliminaire pour rédiger le Plan d'Action Nationale de lutte contre la pêche INN (PAN-INN) de la Mauritanie<br><br>- Révision et mise à jour du PAN-INN du Cabo Verde | Le cadre juridique des Etats membres de la CSRP et du CPCO sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est examiné, analysé et harmonisé avec le cadre juridique international | - Document synthèse de l'AECP sur l'étude sur l'examen et l'analyse du cadre juridique des pays de la CSRP et CPCO sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée<br><br>- Rapport de l'AECP sur atelier sous régional de partage de l'étude et/ou de validation de l'étude<br><br>- Les lois et règlements des Etats membres harmonisés avec le cadre juridique international de la lutte contre la pêche INN | - Disponibilité de l'EFCA<br><br>- Participation effective des États membres au processus |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Extr. 1.2 :** 04 Plans d'action nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN sur requête des Etats membres | Au moins 4 pays disposent de plans nationaux pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN | | | 0 | 0 | 0 | - Démarrage de l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie par un atelier virtuel de partage du Rapport d'analyse préliminaire) | - 1 Rapport d'analyse préliminaire et l'élaboration du PAN-INN de la Mauritanie est en cours | 4 plans nationaux adoptés dans l'ensemble des Etats membres | - Site de la FAO énumérant les plans d'action nationaux<br><br>- Rapports du projet<br><br>- Rapports des services des pêches des Etats membres | Participation effective des États membres au processus |
| | **Extr. 1.3 :** Promotion de la ratification par la Guinée Bissau et mise en œuvre de l'Accord sur les mesures du ressort de l'Etat du port | Instrument de ratification de l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures du ressort par la Guinée Bissau | | 6 EM ont ratifié l'accord (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 EM de la CSRP adhèrent à l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures du ressort de l'Etat du port | - Site de la FAO énumérant les plans d'action nationaux<br><br>- Rapports du projet<br><br>- Rapports des services des pêches des Etats membres | Volonté et engagement de la Guinée Bissau |
| **Extrants liés au Résultat 2 :** | **Extr. 2.1 :** Soutien de la mise en œuvre de la convention SCS et organisation de 04 réunions du GTSCS | - Adoption de la Convention SCS | | 0 | 0 | 0 | 05 états sont favorables à l'adoption | Existence d'un projet de texte consensuel qui intègre les réserves de la Guinée et de la Mauritanie | Envoi pour étude du projet de texte consensuel de la convention SCS aux 7 membres du Comité de coordination. Le document n'a pas été approuvé à l'occasion de la conférence des Ministres | La convention SCS est adoptée et opérationnalisée | - Le texte signé de la convention SCS | Volonté et engagement des Etats membres |
| | | - Tenue des 04 réunions du GTSCS. | | 0 | Tenue de la 1ère réunion du GTSCS pour le lancement de l'action | Tenue de la 2ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan de | Tenue de la 3ème réunion du GTSCS pour partager | 0 | Tenue deux réunions du GTSCS :<br><br>- la 4ème réunion du GTSCS pour | 04 réunions du GTSCS sont tenues | Rapports des réunions du GTSCS | Volonté et engagement des Etats membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | l'an 1 et valider le PTA de l'an 2 | et évaluer le bilan des activités de l'an 2 et valider le PTA de l'an 4 | | partager et évaluer le bilan des activités de l'an 4 et valider le PTA de l'an 5<br><br>- la 5ème réunion du GTSCS pour partager et évaluer le bilan des activités de l'an 5 et discuter des perspectives après le projet | | | |
| | **Extr. 2.2 :** Développement et mise en œuvre d'un système de reporting et d'échange de données. | - Existence de procédures / plateformes pour échanger des informations sur le SCS | | 0 | 0 | Tenue de 2 ateliers techniques nationaux de saisie des données du registre sous régional des navires de pêche | Tenue de 4 ateliers techniques nationaux de saisie des données du registre sous régional des navires de pêche | Amélioration du contenu et de fonctionnalité du registre sous régional des navires de pêche | 0 | Le registre sous régional des navires de pêche est opérationnalisé | - Site web de la CSRP<br><br>- Rapports des ateliers nationaux de saisie des données<br><br>- Rapports des structures SCS des EM | Volonté et engagement des Etats membres |
| | **Extr. 2.3 :** Participation aux ateliers de l'AECP sur la gestion des risques de pêche INN. | - Nombre de personnes des structures SCS ayant participé aux ateliers de l'AECP sur la gestion des risques de pêche INN | | 0 | 17 personnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 personnes des structures SCS des EM | - Rapports des ateliers de l'AECP sur la gestion des risques de pêche INN<br><br>- Rapports du projet | Coopération et collaboration des structures SCS des États membres |
| | **Extr. 2.4 :** Organisation de 7 ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN pour la synergie des structures | -Tenue de 7 ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN pour renforcer la synergie entre les structures | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 02 ateliers interministériels tenus en Gambie et au Sénégal. | 7 ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN pour renforcer la synergie entre les structures parties prenantes au SCS | - Rapports des ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN<br><br>- Rapports du projet | Coopération et collaboration des structures SCS des États membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | parties prenantes au SCS | parties prenantes au SCS | | | | | | | | | - Convention de partenariat, protocoles d'accord et d'échange d'expériences signés | |
| | **Extr. 2.5 :** Elaboration de protocoles d'accord et d'échange d'expériences entre la CSRP et les partenaires comme CICTA, Interpol, ONUDC, Centre de gestion des ressources côtières et marines de la CEDEAO. | - Nombre de conventions de partenariat / de protocoles d'accord et d'échange d'expériences signés | | 0 | 1 protocole d'accord CSRP-AECP-CPCO-ARSTM/ISMI | 0 | 0 | 1 protocole d'accord, entre la CEDEAO, le CPCO et la CSRP, pour renforcer le lien institutionnel entre les trois parties | 0 | 6 Conventions de partenariat / de protocoles d'accord et d'échange d'expériences signés avec la CICTA, Interpol, ONUDC, Centres opérationnels de la CEDEAO. | - Conventions de partenariat / de protocoles d'accord et d'échange d'expériences signés<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement des Etats membres |
| **Extrants liés au Résultat 3 :** | **Extr. 3.1 :** Acquisition d'un véhicule et d'une motocyclette pour assurer la mobilité du centre opérationnel de Banjul. | - Disponibilité d'1 voiture et d'1 mobylette à Banjul | | 0 | 1 mobylette | 1 voiture | 0 | 0 | 0 | 1 voiture et 1 mobylette disponible au DSCSA/UCOS à Banjul | - PV de réception de la voiture<br><br>- PV de réception de la mobylette<br><br>- Documents d'inventaire du matériel du projet<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de la CSRP |
| | **Extr. 3.2 :** Acquisition d'équipements de visioconférence au niveau de chaque Etat membre, du DSCSA/UCOS à Banjul et de la CSRP à Dakar. | - Installation de 11 kits de visioconférences au niveau de chaque Etat membre, du DSCSA/UCOS à Banjul et de la CSRP à Dakar. | | 0 | 5 kits | 6 kits | 0 | 0 | 0 | 11 kits de visioconférences au niveau des Etats membres du DSCSA/UCOS à Banjul et de la CSRP à Dakar. | - PV de réception des kits de visioconférence<br><br>- Documents d'inventaire du matériel du projet | Volonté et engagement de la CSRP et des Etats membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | - Rapports du projet | |
| | **Extr. 3.3 :** Acquisition d'un VMS et d'un système d'identification automatique (AIS) | - Installation du VMS et du système d'identification automatique (AIS) pour la coordination de la surveillance sous régionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 VMS/AIS sous régional opérationnel | - PV de réception du VMS/AIS sous régional<br><br>- Documents d'inventaire du matériel du projet<br><br>- Rapports de veille du VMS/AIS sous régional<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement des Etats membres |
| | **Extr. 3.4 :** Acquisition d'un groupe électrogène et d'un système secouru d'électricité pour le DSCSA/UCOS à Banjul | - Disponibilité d'un groupe électrogène et d'un système secouru d'électricité du DSCSA/UCOS | | 0 | 0 | - 1 groupe électrogène<br><br>- 1 système secouru d'électricité | - 1 dispositif sécurité incendie bureaux équipe projet<br>- 1 dispositif vidéosurveillance bureaux équipe projet<br>- 1 système backup pour la visioconférence | 0 | 0 | 1 groupe électrogène et 1 système secouru d'électricité du DSCSA/UCOS à Banjul | - PV de réception du groupe électrogène du système secouru d'électricité<br><br>- Documents d'inventaire du matériel du projet<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de la CSRP |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Extr. 3.5 : Acquisition de 15 téléphones satellitaires pour renforcer les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals engagés dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches. | - Disponibilité de 15 téléphones satellitaires dans les Etats membres et au niveau du DSCSA/UCOS à Banjul | | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 téléphones smartphones robustes ; et<br><br>7 antennes de téléphones satellitaires | 0 | 15 téléphones satellitaires dans les Etats membres et au niveau du DSCSA/UCOS à Banjul | - PV de réception des téléphones satellitaires<br><br>- Documents d'inventaire du matériel du projet<br><br>- Rapports des opérations sous régionales de surveillance des pêches<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de la CSRP et des Etats membres |
| | Extr. 3.6 : Acquisition de tenues et d'équipements SCS pour les inspecteurs des 7 Etats membres de la CSRP | Dotation des inspecteurs des pêche des 7 Etats membres en tenues et équipements SCS | 0 | 0 | 0 | 0 | Les inspecteurs des pêches de 6 Etats membres sont dotés en tenues et équipements SCS | 0 | 0 | Les inspecteurs des pêches de 7 Etats membres sont dotés en tenues et équipements SCS | - PV de réception des tenues et équipement SCS<br><br>- Documents d'inventaire du matériel du projet<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de la CSRP et des Etats membres |
| **Extrants liés au Résultat 4 :** | **Extr. 4.1 :** Organisation de 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches des Etats membres. | Tenue des 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches des Etats membres. | | 0 | 1 atelier national de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches de la Guinée | 1 atelier national de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches de la Gambie | 1 atelier national de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches de la Sierra Léone | 5 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches du Cabo verde, du Sénégal et de la Mauritanie | 2 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches de la Guinée Bissau et de la Sierra Léone | 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches des Etats membres. | - Rapports des ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches<br><br>- Attestations de réussite<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de la CSRP et des Etats membres |
| | **Extr. 4.2 :** Organisation de 7 ateliers nationaux de renforcement | Tenue des 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des observateurs des | - Rapports des ateliers nationaux de renforcement des capacités | Volonté et engagement de la CSRP et |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | des capacités des observateurs des pêches des Etats membres. | des observateurs des pêches des Etats membres. | | | | | | | | pêches des Etats membres. | des observateurs des pêches<br><br>- Attestations de réussite<br>- Rapports du projet | des Etats membres |
| | **Extr. 4.3 :** Organisation de 02 ateliers sous régionaux de sensibilisation au profit du personnel de la justice. | Tenue de 02 ateliers sous régionaux de sensibilisation au profit du personnel de la justice. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ateliers sous régionaux de sensibilisation au profit du personnel de la justice. | - Rapports des ateliers sous régionaux de sensibilisation au profit du personnel de la justice<br><br>- Attestations de participation<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de l'AECP, de la CSRP et des Etats membres |
| | **Extr. 4.4 :** Organisation d'une conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN. | Tenue d'une conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tenue d'1 conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN. | 1 conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN. | - Rapports de la conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN.<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de la CSRP et des Etats membres |
| | **Extr. 4.5 :** Au besoin, organisation d'une formation nationale sur le terrain et des séances d'échange d'expériences à l'intention des inspecteurs nationaux des pêches (formation des formateurs et inspecteurs nationaux), des | Nombre de formation nationale organisé par l'AECP sur le terrain des opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel | | 0 | 0 | 02 ateliers de renforcement des capacités des opérateurs/ des centres de surveillance des pêches des pays francophones et lusophones de la CSRP | 0 | 0 | 4 ateliers nationaux de formation des opérateurs sur l'utilisation des systèmes VMS/AIS et satellitaires en Gambie, Guinée, Mauritanie et Sierra Léone | Au moins 02 formations nationales sur le terrain | - Rapports des ateliers de formations<br><br>- Attestations de participation<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement de l'AECP, de la CSRP et des Etats membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel des autres agences et ministères. | des autres agences et ministères. | | | | | | | | | | |
| **Extrants liés au Résultat 5 :** | **Extr. 5.1 :** Organisation de 7 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type A. | Planification et conduite de 7 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type A. | | | 2 (Opération « BADJIGUI KOUYATE » et Opération « KUTA ») | 0 | 3 (opération STINGRAY : 3 opérations de 5 jours regroupés en 01 de 15 jours) | 1 (Opération de type A, baptisée « SEYDOUBA CAMARA ») | 1 (Opération de type A, baptisée « BICA ») et 1 (opération PESCAO/AFRICAN MEMO) | 7 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type A. | - Les rapports techniques et financiers des opérations sous régionales de surveillance des pêches de type A | Coopération, collaboration et engagement des États membres |
| | **Extr. 5.2 :** Organisation de 2 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type B. | Planification et conduite de 2 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type B. | | | 1 (Opération « Mory GNINGUE ») | 01 (Opération « TESSITO ») | 0 | 0 | 0 | 2 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type B. | - Les rapports techniques et financiers des opérations sous régionales de surveillance des pêches de type B | Coopération, collaboration et engagement des États membres |
| | **Extr. 5.3 :** Organisation de 5 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type C. | Planification et conduite de 5 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type C. | | | 1 (Opération « Alexandre BAPTISTA ») | 1 (Opération « SARDINELLE ») | 0 | 3 (Opération « SIZU » et Opération « CRE MOHAMED LEMINE LEFDHAL » (2 opérations de 5 jours regroupée en 1 de 10 jours) , | 0 | 5 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type C. | - Les rapports techniques et financiers des opérations sous régionales de surveillance des pêches de type C | Coopération, collaboration et engagement des États membres |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Extrants liés au Résultat 6 :** | **Extr. 6.1 :** Recrutement d'un Expert SCS pour assurer la coordination du programme des observateurs à compétence sous régionale | Sélection par appel à candidature d'un Expert pour coordonner le programme des observateurs à compétence sous régionale | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (Le dossier d'appel est déjà diffusé) | 0 (la convention SCS n'a pas été adoptée) | Le programme des observateurs à compétence sous régionale est coordonné par un Expert SCS | - PV de sélection de l'Expert SCS<br><br>- Rapports de mise en œuvre du programme des observateurs à compétence sous régionale (rapports de marée et rapports des Etats membres et du coordonnateur du programme)<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement des Etats membres à adopter la convention SCS |
| | **Extr. 6.2 :** Organisation d'une réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs régionaux regroupant les parties prenantes concernées par le programme (CSRP, Directions des pêches, structures SCS et centres de recherche des Etats membres, armateurs, ICCAT et ORP). | Tenue d'une réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs régionaux | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Le partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs régionaux | - Rapports de la réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs régionaux<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement des Etats membres à adopter la convention SCS |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Extr. 6.3 :** Sélection de 30 observateurs nationaux pour composer le programme des observateurs à compétence sous régionale. | Choix des 30 observateurs nationaux devant composer le programme des observateurs à compétence sous régionale. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 observateurs à compétence sous régionale | - PV de sélection des observateurs à compétence sous régionale<br><br>- Contrats des observateurs à compétence sous régionale<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement des Etats membres à adopter la convention SCS |
| | **Extr. 6.4. :** Organisation d'un atelier sous régional pour renforcer les capacités des 30 observateurs nationaux sélectionnés pour composer le programme des observateurs à compétence sous régionale. | Tenue d'un atelier sous régional de renforcement des capacités des 30 observateurs nationaux sélectionnés | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 atelier sous régional de renforcement des capacités des observateurs nationaux sélectionnés | - Rapports de l'atelier sous régional de renforcement des capacités des observateurs nationaux sélectionnés<br><br>- Attestations de réussite<br><br>- Rapports du projet | Volonté et engagement des Etats membres à adopter la convention SCS |

| | **Activités** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Libellé des activités** | | **Indicateurs de suivi** | **Ressources à mobiliser** | **Préconditions avant que l'activité ne commence** | **Préparation de l'activité** |
| **Activités liées au Résultat 1 :** | **A 1.1 :** Examiner et mettre à jour les lois/règlements nationaux conformément aux conventions et instruments internationaux dans le domaine de la pêche (y compris les ORGP) | Appui apporté à AECP dans l'examen et l'analyse du cadre juridique des Etats Membres de la CSRP sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée | - Billet d'avion<br>- Perdium<br>- Transport interne | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ;<br>- Envoi à l'AECP et à la CSRP, par l'Etat intéressé, des projets de lois / règlements à mettre à jour<br>- Désignation des participants par les EM<br>- Organisation logistique de la réunion par l'AECP en collaboration avec la CSRP et les EM |
| | **A 1.2 :** Elaborer des plans d'action nationaux pour | Au moins 4 Etats membres disposent de plans nationaux | - Billet d'avion<br>- Perdium<br>- Transport interne | - Expression des besoins par les EM<br><br>- Appui de l'AECP aux EM | - Recueil et analyse des besoins d'appui exprimés par les EM (CSRP et AECP) ;<br>- Préparations administratives (information des autorités administrative concernées) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN ; | pour prévenir, dissuader et éliminer la pêche INN | | | - Organisation logistique de l'appui à donner par l'AECP et la CSRP |
| | **A 1.3 :** Promouvoir la ratification et soutenir la mise en œuvre de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. | Instrument de ratification par la Guinée Bissau de l'Accord de 2009 de la FAO sur les mesures du ressort de l'Etat du Port | | - Appui de l'AECP et de la CSRP à la Guinée Bissau | |
| **Activités liées au Résultat 2 :** | **A 2.1 :** opérationnaliser /développer des accords de coopération pour le suivi, le contrôle et la surveillance (droit de suite, échange d'informations, coordination des interventions, etc.). | - Adoption de la Convention SCS<br><br>- Tenue des 04 réunions du GTSCS. | - Billet d'avions ; - Perdiums ; - location voiture ; - Transport internes ; - Traduction documents en anglais ; - Traduction documents en portugais ; - Interprètes (Français/Portugais/anglais) ; - Communication ; - Restauration ; - Journalistes ; Fourniture de bureau | - Appropriation de la convention SCS par au moins 04 EM.<br><br>- Disponibilité d'un rapport d'étape annuel sur le projet. | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP<br>- Organisation logistique de la rencontre |
| | **A 2.2 :** soutenir le développement et la mise en œuvre de systèmes de rapport et d'échange de données (procédures et plateformes pour échanger des informations sur les licences, les permis des navires, les inspections menées et les infractions, etc.). | - Existence de procédures / plateformes pour échanger des informations sur le SCS<br><br>- Opérationnalisation du registre sous régional des navires de pêche | - Billet d'avions ; - Perdiums ; - Transport internes ; - Traduction documents en anglais ; - Traduction documents en portugais et en anglais ; - Communication ; - Restauration ; - Journalistes ; Fourniture de bureau | - Accord entre les acteurs impliqués sur les modalités et conditions idoines.<br>- Appropriation du registre sous régional des navires de pêche par au moins 02 EM.<br>- Tenue des ateliers techniques nationaux de saisie des données dans au moins 02 EM | - Elaboration des TDR et des agendas des ateliers par la CSRP ;<br><br>- Information des autorités des EM ;<br><br>- Organisation logistique des ateliers techniques nationaux de saisie des données. |
| | **A 2.3 :** développer les | - Nombre de personnes des | - Billet d'avions ; - Perdiums. | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | renseignements, la gestion des risques et une meilleure planification stratégique du suivi, du contrôle et de la surveillance (avec notamment des ateliers régionaux et le développement d'une catégorisation des risques, et un cadre d'évaluation et de gestion) | structures de SCS qui ont participées aux ateliers de l'AECP sur la gestion des risques | | | - Désignation des participants par les EM<br>- Organisation logistique de la réunion par l'AECP en collaboration avec la CSRP et les EM |
| | **A 2.4 :** établir/renforcer la coopération inter agences et interministérielle au niveau national (notamment avec les ministres de la justice, les services des douanes, les autorités portuaires et la Marine) | -Tenue de 7 ateliers nationaux interministériels sur la pêche INN pour la synergie des structures parties prenantes au SCS | - Billet d'avions ; - Perdiums ; - location voiture ; - Transport internes ; - Traduction documents en anglais ; - Traduction documents en portugais ; - Communication ; - Restauration ; - Journalistes ; Fourniture de bureau | Identification et implication des structures parties prenantes au SCS par la CSRP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP<br>- Organisation logistique de la rencontre |
| | **A 2.5 :** développer/renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance communautaires grâce à l'échange d'expériences en la matière et une coopération renforcée entre les communautés de pêcheurs / ONG et les | - Nombre de conventions de partenariat, de protocoles d'accords et d'échanges d'expériences signés | - | Volonté et intérêt de coopération des parties concernées | - Définition du contenu et élaboration des projets de convention de partenariat de protocoles d'accords et d'échanges d'expériences par les parties concernées |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | autorités nationales et régionales chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance | | | | |
| | **A 2.6 :** renforcer la coopération avec d'autres organisations impliquées dans la lutte contre la pêche INN et d'autres activités criminelles (CICTA, Interpol, ONUDC, Centre de gestion des ressources côtières et marines de la CEDEAO, etc.). | - Nombre de conventions, de partenariats / de protocoles d'accords et d'échanges d'expériences signés | - | Volonté et intérêt de coopération des parties concernées | - Définition du contenu et élaboration des projets de convention de partenariat / de protocoles d'accord et d'échange d'expériences par les parties concernées |
| **Activités liées au Résultat 3 :** | **A 3.1 :** doter l'unité de coordination SCS de la CSRP véhicule et d'une motocyclette pour assurer la mobilité du centre opérationnel de Banjul. | - Disponibilité d'1 voiture et d'1 mobylette à Banjul | - Billet d'avion ; - Perdiums ; - Transport interne ; Fournisseur voiture ; - PV de réception. | - Sélection d'un fournisseur | - Elaboration des documents d'appel d'offre par le Spécialiste en Passation de Marché du projet ;<br>- Publication de l'appel ;<br>- Réception, évaluation des offres et sélection d'un fournisseur.<br>- Elaboration et signature du contrat de prestation. |
| | **A 3.2 :** améliorer les services de télécommunication entre le centre des opérations des États membres et celui de l'unité de coordination SCS de la CSRP | - Installation de 11 kits de visioconférences au niveau de chaque Etat membre, du DSCSA/UCOS à Banjul et de la CSRP à Dakar. | - Billet d'avion ; Perdium ; Transport Interne ; Fournisseur visioconférence ; - PV de réception | - Sélection d'un fournisseur | - Elaboration des documents d'appel d'offre par le Spécialiste en Passation de Marché du projet ;<br>- Publication de l'appel ;<br>- Réception, évaluation des offres et sélection d'un fournisseur.<br>- Elaboration et signature du contrat de prestation. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A 3.3 :** doter l'unité de coordination SCS de la CSRP d'un système VMS régional et d'un système d'identification automatique (AIS) régional. | - Installation du VMS et du système d'identification automatique (AIS) pour la coordination de la surveillance sous régionale | - Fournisseur VMS ; - PV de réception | - Définition des caractéristiques du VMS ;<br>- Sélection d'un fournisseur ;<br>- Opérationnalisation de la convention SCS. | - Préparation des documents d'acquisitions des équipements par l'AECP en collaboration avec le Spécialiste en Passation des Marchés et le Chef du DSCSA (Coordinateur du projet)<br>- Publication de l'appel ;<br>- Réception, évaluation des offres et sélection d'un fournisseur par l'AECP en collaboration avec le Spécialiste en Passation des Marchés et le Chef du DSCSA (Coordinateur du projet).<br>- Elaboration et signature du contrat de prestation par l'AECP en collaboration avec le Spécialiste en Passation des Marchés et le Chef du DSCSA (Coordinateur du projet). |
| | **A 3.4 :** garantir un approvisionnement fiable en énergie électrique des installations régionales du DSCSA/UCOS. | - Disponibilité d'un groupe électrogène et d'un système secouru d'électricité du DSCSA/UCOS | - Billet d'avion ; - Consultant ; Transport interne ; - Fournisseur Groupe électrogène ; - Perdiums ; - PV de réception | - Sélection d'un fournisseur et d'un consultant | - Elaboration des documents d'appel d'offre par le Spécialiste en Passation de Marché du projet ;<br>- Publication de l'appel ;<br>- Réception, évaluation des offres et sélection d'un fournisseur.<br>- Elaboration et signature du contrat de prestation. |
| | A.3.5 : Renforcer les communications entre le Poste sous régional de coordination de l'opération et les moyens navals engagés dans les opérations sous régionales de surveillance des pêches | - Disponibilité de 15 téléphones satellitaires dans les Etats membres et au niveau du DSCSA/UCOS à Banjul | - Fournisseur téléphone satellitaires ; - PV de réception | - Sélection d'un fournisseur | - Elaboration des documents d'appel d'offre par le Spécialiste en Passation de Marché du projet ;<br>- Publication de l'appel ;<br>- Réception, évaluation des offres et sélection d'un fournisseur.<br>- Elaboration et signature du contrat de prestation. |
| **Activités liées au Résultat 4 :** | **A 4.1 :** développer un tronc commun / un cadre de certification sectoriel basé plus particulièrement sur l'annexe E de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port de la FAO, afin de garantir la comparabilité | Tenue des 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des inspecteurs des pêches des Etats membres. | - Billets d'avion ; Perdiums ; Transport interne ; Carburant véhicule ; carburant groupe électrogène ; Restauration et pause-café ; location voiture, Communication, Produits d'entretien ; Prime agent ; Transport participants ; Transport journalistes ; Fourniture de bureau | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Elaboration et signature du contrat de l'organisation de l'atelier par la CSRP et la Structuré SCS du pays concerné ;<br>- Transfert du budget de l'atelier à la Structuré SCS du pays concerné ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP |
| | | Tenue des 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités des observateurs | - Billets d'avion ; Perdiums ; Transport interne ; Carburant véhicule ; carburant groupe électrogène ; Restauration et pause-café ; location voiture, Communication, Produits d'entretien ; Prime agent ; Transport participants ; Transport journalistes ; Fourniture de bureau | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Elaboration et signature du contrat de l'organisation de l'atelier par la CSRP et la Structuré SCS du pays concerné ; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | des certifications des inspecteurs des pêches travaillant dans les sous-régions. | des pêches des Etats membres. | | | - Transfert du budget de l'atelier à la Structuré SCS du pays concerné ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP |
| | **A 4.2 :** au besoin, en coopération avec les instituts de formation nationaux, organiser une formation nationale sur le terrain et des séances d'échange d'expériences à l'intention des inspecteurs nationaux des pêches (formation des formateurs et inspecteurs nationaux), des opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel des autres agences et ministères. | Nombre de formations nationales organisées par l'AECP sur le terrain des opérateurs/du personnel travaillant dans les centres de surveillance des pêches (CSP) nationaux, y compris sur les aspects opérationnels et du personnel des autres agences et ministères. | - Billet d'avion ; Perdium ; Transport interne | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Envoie des invitations par la CSRP ;<br>- Etablissement de la liste des participants par les EM ;<br>- Réservation des billets d'avion par l'AECP ; |
| | **A 4.3 :** organiser une formation régionale sur le terrain et des séances d'échanges d'expériences à l'intention du | Tenue de 02 ateliers sous régionaux de sensibilisation au profit du personnel de la justice. | - Billets d'avion ; Perdiums ; Transport interne ; Carburant véhicule ; carburant groupe électrogène ; Restauration et pause-café ; location voiture, Communication, Produits d'entretien ; Prime agent ; Transport participants ; Transport journalistes ; Fourniture de bureau | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | personnel des CSP travaillant dans les CSP sous régionaux, des procureurs/du personnel judiciaire, éventuellement en coopération avec le réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest (WACAP) et les programmes de sécurité maritime financés par l'Union européenne**.** | | | | |
| | **A 4.4 :** organiser une formation spécifique et des séances d'échange d'expériences sur les systèmes de certification des captures adoptés par les ORGP et le règlement sur la pêche INN de l'Union européenne pour les agents chargés de vérifier et de valider les certificats de capture. | Tenue d'une conférence internationale de sensibilisation et de partage d'expériences sur la pêche INN. | - Billets d'avion ; Perdiums ; Transport interne ; Carburant véhicule ; carburant groupe électrogène ; Restauration et pause-café ; location voiture, Communication, Produits d'entretien ; Prime agent ; Transport participants ; Transport journalistes ; Fourniture de bureau | Implication de la CSRP et des Etats membres par l'AECP | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par l'AECP en collaboration avec la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP |
| **Activités liées au Résultat 5 :** | **A 5.1 :** offrir un appui à l'organisation et à la mise en œuvre d'opérations SCS conjointes, | - Planification et conduite de 7 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type A. | - Pour les 03 types d'opérations :<br>Billets d'avion ; Perdiums ; Poste de Coordination ;<br><br>- Type A :<br>Patrouilleur sous régional ; Vedette Guinée ; Vedette Guinée Bissau ; Vedette Sierra Léone ; | Définition des modalités d'affrètement et d'appui des moyens SCS | - Elaboration des ordres d'opérations générales et particulières par la CSRP, en collaboration avec les structures SCS ;<br>- Etablissement des contrats cadres et sous contrat entre la CSRP et les Structures SCS engagées ; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | y compris l'échange d'effectifs et de moyens, et assurer des séances d'information opérationnelles (régionales).<br>**A 5.2 :** planifier et mener des opérations conjointes (aériennes et maritimes), y compris l'affrètement éventuel de navires/d'avions.<br>**A 5.3 :** rechercher des synergies avec les activités opérationnelles menées dans le cadre des programmes de sécurité maritime financés par l'Union (par ex. des exercices conjoints, l'échange d'informations, etc.). | - Planification et conduite de 4 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type B.<br><br>- Planification et conduite de 3 opérations sous régionales de surveillance des pêches de type C. | - Type B :<br>Patrouilleur sous régional du Sénégal ; Vedette de la Gambie ; Vedette de la Guinée Bissau<br><br>- Type C :<br>Patrouilleur sous régional du Cabo Verde ;<br>Patrouilleur sous régional de la Mauritanie et<br>Patrouilleur sous régional du Sénégal | | Information des autorités administratives des pays engagés par la CSRP ;<br>- Transfert des fonds d'appui par la CSRP ; |
| **Activités liées au Résultat 6 :** | **A 6.1 :** analyser les enseignements tirés des projets pilotes/études récentes et consulter les parties prenantes concernées (armateurs, CICTA, ORP, scientifiques et administrations nationales des | Tenue d'une réunion internationale de partage d'expériences sur l'embarquement des observateurs régionaux | - Billets d'avion ; Perdiums ; Transport interne ; Carburant véhicule ; carburant groupe électrogène ; Restauration et pause-café ; location voiture, Communication, Produits d'entretien ; Prime agent ; Transport participants ; Transport journalistes ; Fourniture de bureau | - Opérationnalisation de la convention SCS. | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP ;<br>- Réservation et envoi des billets d'avion par la CSRP. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | pêches) pour concevoir un programme rentable et pratique. | | | | |
| | **A 6.2 :** sélectionner des observateurs régionaux parmi les observateurs nationaux et les former. | Choix des 30 observateurs nationaux devant composer le programme des observateurs à compétence sous régionale. | - Billet d'avion ; Perdium ; Transport interne | - Opérationnalisation de la convention SCS.<br>- Implication des EM dans la définition des critères de choix par la CSRP | - Définition et partage des critères de sélection par la CSRP |
| | **A 6.3 :** équiper les observateurs. | Equipements mis à la disposition des observateurs | - Equipements | - Opérationnalisation de la convention SCS.<br>- Sélection des 30 observateurs | - Liste des besoins matériels |
| | **A 6.4 :** assurer la coordination du programme des observateurs régionaux. | Sélection par appel à candidature d'un Expert pour coordonner le programme des observateurs à compétence sous régionale | - Billet d'avion ; Perdium ; Transport interne | - Opérationnalisation de la convention SCS. | - Elaboration des documents d'appel d'offre par le Spécialiste en Passation de Marché du projet ;<br>- Publication de l'appel ;<br>- Réception, évaluation des offres et sélection d'un Expert.<br>- Elaboration et signature du contrat de prestation. |
| | **A 6.5 :** mettre au point des mécanismes pour un financement durable. | Tenue d'un atelier sous régional de renforcement des capacités des 30 observateurs nationaux sélectionnés | - Billets d'avion ; Perdiums ; Transport interne ; Carburant véhicule ; carburant groupe électrogène ; Restauration et pause-café ; location voiture, Communication, Produits d'entretien ; Prime agent ; Transport participants ; Transport journalistes ; Fourniture de bureau | - Opérationnalisation de la convention SCS. | - Elaboration des TDR et de l'agenda de l'atelier par la CSRP ;<br>- Information des autorités des EM par la CSRP ;<br>- Envoi des invitations par la CSRP ;<br>- Réservation et envoi des billets d'avion par la CSRP. |
| | | | | | |

### 2.5. Prise en compte du genre

Les activités réalisées dans le cadre de l'Action sont en lien direct avec la pêche INN et concernent un personnel qui opère en mer pendant plusieurs jours et / ou séjourne longtemps dans les salles d'opération. De ce fait, le nombre de femmes qui ont choisi de travailler comme inspectrice des pêches et dans les salles d'opérations de surveillance est faible, même si ces dernières années la situation s'améliore dans certains EM. Toutefois, l'action a enregistré un bon taux de participation des femmes ; sur les 1101 personnes impliquées dans le mise en œuvre, presque les 11% (120) sont des femmes. Le genre a été très bien pris en compte au niveau des ministères et / ou des Directions. D'ailleurs au cours de la période d'exécution de l'action, plusieurs femmes ont occupé le poste de Ministre des pêches au niveau des EM (Guinée, Guinée Bissau, Sénégal).

Concernant le travail des enfants, deux navires ont été arraisonnés (voire ligne 39 et 40 de l'annexe 1) à cause de la présence à bord d'enfants qui ne figuraient pas sur la liste des membres d'équipage ou des passagers.

### 2.6. Suivi et évaluation des activités

La coordination du projet assure le suivi et l'évaluation des activités de l'action. La CSRP est aidée dans ce rôle par les EM (RGTSCS), la DUE – Dakar, la CEDEAO et l'AECP.

- **La CSRP**, envoie des questionnaires au EM pour collecter leurs feedbacks sur les impacts, les effets et l'importance des équipements SCS mis à leurs dispositions. L'ensemble des EM ont confirmé que les résultats du projet sont bons et ses impacts sont positifs, surtout concernant les missions de patrouilles sous régionales, la formation des inspecteurs et des opérateurs et l'utilité des vidéos conférences. En revanche, certains téléphones satellitaires ne sont pas utilisés de manière efficiente à cause du manque de crédit ou d'une formation insuffisante sur son mode de fonctionnement.

- **Des réunions tripartites** (DUE-Dakar, AECP et CSRP) ont été organisées pour apprécier l'état d'avancement des livrables et recadrer, si nécessaire, la mise en œuvre de l'action ;

- **La CEDEAO**, a organisé des réunions du comité de pilotage pour apprécier le niveau de mise en œuvre des trois composantes du PESCAO. Des missions de haut niveau ont été aussi effectuées au niveau de la CSRP par des Experts de la CEDEAO, dirigées parfois par le Commissaire en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eaux de la CEDEAO. Ces missions ont permis d'évaluer les progrès de l'action et un feedback positif a toujours été donné sur le niveau de réalisation des extrants. De plus, la CEDEAO envoie chaque année à la CSRP un questionnaire d'évaluation des indicateurs.

- **L'AECP**, organise chaque année une réunion du comité de pilotage pour partager les réalisations de l'année écoulée et planifier les activités de l'année qui suit. Le niveau de réalisation de l'appui technique donné aux EM est jugé satisfaisant pour la plupart du temps ;

- **La DUE – Dakar**, a commandité un audit financier de l'année 1 de l'action et un audit ROM. Les résultats de l'audit financier étaient globalement satisfaisants et des recommandations ont été formulées sur le contrôle interne et la justification des opérations de surveillance. Ainsi, des mesures correctives ont été apportées à l'occasion de la 2e RGTSCS avec l'appui technique de l'Expert financier de la DUE – Dakar. Les résultats de l'audit ROM étaient aussi satisfaisants et des options ont été suggérées pour la mise en œuvre du programme des observateurs sous régionaux ;

- **L'UE**, a commandité une évaluation à mi-parcours du PESCAO pour apprécier le niveau d'atteinte des résultats. Les résultats de la composante 2, dans laquelle appartient l'Action a été jugée efficace.

### 2.7. Suivi des modifications.

Pendant la mise en œuvre de l'action, deux modifications majeures relatives à la durée du projet et à la logique d'intervention ont été apportées.

1. **Modification de la durée du projet :** Lancé en juin 2018, la fin normale du projet devait être le 30 avril 2022. Cependant, compte tenu des retards causés par la pandémie Covid-19, qui est un événement imprévisible et irrésistible (cas de force majeure), la CSRP a demandé à la DUE – Dakar et a obtenu une prorogation de douze **(12)** mois de l'action, afin d'exécuter les activités en retard. Ainsi, l'Avenant N° 1 au Contrat de subvention N° FED / 2018 / 392 – 671 a été signé, pour modifier **l'Article 2-** *« période de mise en œuvre de l'action »* des **Conditions particulières** du contrat de subvention. A cet effet, la durée

de mise en œuvre de l'action est passée de 48 mois à 60 mois sans financement supplémentaires. C'est pourquoi, la **date de fin** de l'**action** a été prolongée jusqu'au **30 avril 2023.**

2. **Modification du nombre d'opérations conjointes de surveillance de type B :** Dans la description de l'action (**Annexe 1 du contrat de subvention**), il avait été prévu l'organisation de quatorze **(14)** missions conjointes de patrouille sous régionale, principalement dans la zone Sud de la CSRP, qui est la partie la plus affectée par la pêche INN. Ainsi, il avait été planifié dans le budget de l'action **(Annexe III du contrat de subvention)**, la réalisation de : **i.** sept **(7)** opérations de type A, couvrant les ZEE de Guinée Bissau, de Guinée et de Sierra Léone ; **ii.** quatre **(4)** opérations de type B, couvrant les ZEE de Gambie, de Guinée Bissau et du Sénégal ; et **iii.** trois **(3)** opérations de type C, couvrant les ZEE du Cabo Verde, de Mauritanie et du Sénégal. Cependant, la logique d'organisation des opérations de surveillant a été modifiée au courant de l'année 4. Ainsi deux 02 opérations de type B, initialement prévues dans la zone Sud de la CSRP, ont été remplacées par l'organisation de deux (02) opérations de type C couvrant les ZEE de la zone Nord de la CSRP. Les raisons d'une telle modification ont été justifiées par l'organisation d'élections législatives et présidentielles et /ou par une certaine instabilité politique au niveau d'Etats membres concernés, pendant la période de préparation de l'activité.

### 2.8. Leçons apprises et réplication de l'action.

Les leçons majeures tirées de l'action sont :

- ✓ Le renforcement des capacités du personnel SCS des EM peut se faire efficacement en mode virtuel en utilisant le dispositif de vidéoconférence. Toutefois, il faudrait associer à la formation des personnes ressources qui ont été déjà formées comme des formateurs, pour assurer les travaux pratiques ;
- ✓ La formation des opérateurs sur le VMS et en analyse et interprétation de données améliore l'efficacité du contrôle des ZEE et permet d'optimiser les moyens financiers dédiés aux missions de patrouilles. Des manuels ont été remis à chaque opérateurs formés pour une réplication des acquis de la formation.
- ✓ Les services maritimes intégrés (IMS) et l'imagerie de Copernicus, corrélés avec les VMS nationaux, améliorent l'efficacités et réduisent les coûts des opérations sous régionales de surveillance des pêches.
- ✓ La participation de la composante aérienne aux opérations de surveillance des pêches améliore significativement l'efficacité de l'activité et décourage les adeptes de pêche INN.

## 2.9. Liste des documents produits pendant la mise en œuvre de l'action

Le tableau suivant liste les documents produits pendant l'action, leurs destinataires et les moyens de diffusion.
**NB :** Tous les documents produits ont été déjà partagés avec la DUE – Dakar.

| N° | Documents produits pendant l'action | Nombre d'exemplaires | Destinataires | Moyens de diffusion | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Electronique | Papier |
| 1 | Rapport de l'atelier de lancement (CSRP) | 11 | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 2 | Rapport technique de l'opération « BADJIGUI KOUYATE » | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 3 | Rapport technique de l'opération « KUTA » | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 4 | Rapport technique de l'opération « MORY GNINGUE » | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 5 | Rapport de l'atelier de formation des inspecteurs des pêches de la Guinée | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 6 | PV de réception signés par les bénéficiaires et contre signés par le Coordinateur du Projet | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 7 | PV de réception signé par le fournisseur et les membres du comité de réception | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 8 | PV de réception signé par le bénéficiaire et contre signé par le Coordinateur du Projet | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 9 | Rapport de l'étude (AECP)<br>Rapport de l'atelier (AECP) | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 10 | Protocole signé par les parties concernées (AECP, CPCO, CSRP et ARSMT-ISMI) | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 11 | Bon de livraison signé par le fournisseur et contre signé par le Comptable du projet | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 12 | PV de réception signé par le réalisateur et contre signé par le Coordinateur du Projet | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 13 | Rapport narratif et financier de l'année 1 de l'action | 03 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 14 | Rapport narratif et financier de l'année 2 de l'action | 03 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 15 | Rapport narratif et financier de l'année 3 de l'action | 03 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 16 | Rapport narratif et financier de l'année 4 de l'action | 03 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |
| 17 | Rapport de la RGTSCS de l'année 2 | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rapport technique de l'opération « STINGRAY », | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 19 | Rapport technique de l'opération « BICA » | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 20 | Rapport technique de l'opération « TESSITO » | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 21 | Rapport technique de l'opération « ALEXANDRE BAPTISTA » | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 22 | Rapport technique de l'opération « SARDINELLE » | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 23 | Rapport technique de l'opération « SIZU | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 24 | Rapport technique de l'opération « CRE MOHAMED LEMINE LEFDHAL » | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 25 | Rapport de l'atelier de formation des inspecteurs des pêches de la Sierra Léone | 1 pour la DUE-Dakar - | DUE-Dakar | Par Email et agent courrier | x | x |
| 26 | Rapport de l'atelier de formation des inspecteurs des pêches du Cabo Verde | 1 pour la DUE-Dakar | DUE-Dakar | Par Email et agent courrier | x | x |
| 27 | Rapport de l'atelier technique national de saisie des données de la Guinée Bissau | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 28 | Rapport de l'atelier technique national de saisie des données du Cabo Verde. | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 29 | Rapport de de l'atelier technique national de saisie des données de la Sierra Léone | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |
| 30 | Rapport de l'atelier technique national de saisie des données de la République de Guinée. | - | DUE-Dakar ; AECP ; 7 EM ; CEDEAO ; CPCO | Par Email et agent courrier | x | |

.

### 2.10. Récapitulation des marchés attribués pendant la période de référence

Le tableau suivant présente les marchés attribués dans la mise en œuvre de l'action, du 03 mai 2018 au 30 Avril 2023.

**RECAPITULATIF DES MARCHES ATTRIBUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE**

| Dénomination marché | Attributaire | Méthode de sélection | Date signature marche | Montant marche en hors taxes | | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FCFA | EUROS | |
| Acquisition et l'installation d'un système de visioconférence | VISIO CONTACT | Demande de cotation | 16/01/2019 | 9 271 250 | 14134 | Marché clôturé |
| Sélection consultant pour installation groupe électrogène | PHILLIP BEYAI | Consultation restreinte | 07/12/2018 | 1 640 000 | 2500 | Marché clôturé |
| Acquisition et installation groupe électrogène | GIGO | Demande de cotation | 12/03/2019 | 13 476 575 | 20545 | Marché clôturé |
| Acquisition climatiseurs | JALAL | Demande de cotation | 18/09/2018 | 940 000 | 1433 | Marché clôturé |
| Achat mobylette pour CSRP Banjul | JAGGLEH TRADING ENTREPRISE | Demande de cotation | 22/10/2018 | 1 161 120 | 1770 | Marché clôturé |
| Réalisation film documentaire sur les activités opérationnelles de la CSRP | EXTAZCOM | Demande de cotation | 16/11/2018 | 2 479 680 | 3780 | Marché clôturé |
| Acquisition mobilier de bureau + Matériel Bureautique | MASTER OFFICE DECO | Demande de cotation | 12/03/2019 | 3 107 268 | 4737 | Marché clôturé |
| Acquisition matériel informatique | ACCESS AMERICAN INFORMATIQUE | Demande de cotation | 06/11/2018 | 10 618 875 | 16188 | Marché clôturé |
| Acquisition fourniture de bureau | SAREDICA | Demande de cotation | 25/04/2019 | 1 925 100 | 2935 | Marché clôturé |
| Acquisition de téléphone satellitaire | VISIO CONTACT | Avenant N°1 au marché relatif à l'acquisition d'un système de visioconférence | 03/04/2019 | 200 000 | 305 | Marché clôturé |
| Acquisition d'une berline pour le Département Suivi Contrôle Surveillance (DSCSA) à Banjul | SHYBEN A MADI | Demande de cotation | 05/08/2019 | 10 790 493 | 16450 | Marché clôturé |
| Acquisition de matériels informatiques complémentaires pour l'équipe du PESCAO | OUMOU | Demande de cotation | 10/07/2019 | 1 772 000 | 2701 | Marché clôturé |

| Dénomination marché | Attributaire | Méthode de sélection | Date signature marche | Montant marche en hors taxes | | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FCFA | EUROS | |
| Installation de quatre (04) postes téléphoniques pour l'équipe du PESCAO | SAFAR TECHNOLOGIE | Marché cadre (Bon de commande) | 10/07/2019 | 180 000 | 274 | Marché clôturé |
| Fourniture d'autocollants | MPS | Achat direct | 23/04/2019 | 81 000 | 123 | Marché Clôturé |
| Achat complémentaire de six (06) kits de visioconférence | MISMO | Demande de cotation | 10/06/2019 | 14 153 000 | 21576 | Marché clôturé |
| Pause-café pour les missions d'audit ROM et financier de la mise en œuvre du contrat de subvention | GIE SIGGIL TRAITEUR | Demande de cotation | 04/09/2019 | 300 000 | 457 | Marché clôturé |
| Traduction en anglais du rapport de l'atelier de lancement du PESCAO | Codou DIENE | Bon de commande | 25/04/2019 | 819 450 | 1249 | Marché clôturé |
| Avenant au contrat relatif à l'acquisition et l'installation d'un groupe électrogène pour le DSCSA à Banjul. | GIGO CONSTRUCTION LTD | Avenant au contrat | 22/08/2019 | 2 492 636 | 3800 | Marché clôturé |
| Fourniture d'une table secrétaire pour l'équipe du PESCAO | MASTER OFFICE | Bon de commande | 30/08/2019 | 84 746 | 129 | Marché clôturé |
| Confection de cachets pour l'équipe du PESCAO | BBMSS | Bon de commande | 02/09/2019 | 35 000 | 53 | Marché clôturé |
| Confection d'articles de communication pour la 2ème réunion du Groupe de travail Suivi, Contrôle et Surveillance (GTSCS) (banderoles, blocs notes et stylos personnalisés) | MANDARINE | Demande de cotation | 04/09/2019 | 1 135 000 | 1730 | Marché clôturé |
| Acquisition de fournitures de bureau | SAREDICA | Bon de commande (Contrat de clientèle) | 11/09/2019 | 178 500 | 272 | Marché clôturé |
| Interprétation et location de matériels d'interprétariat pour la 2ème réunion du GTSCS | FATIMATA TALL DIEYE | Contrat de clientèle | | 5 910 000 | 9010 | Marché clôturé |
| Confection de 2000 dépliants pour la 2ème réunion du GTSCS | LA ROCHETTE | Demande de cotation | 18/11/2019 | 660 000 | 1006 | Marché clôturé |

| Dénomination marché | Attributaire | Méthode de sélection | Date signature marche | Montant marche en hors taxes | | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FCFA | EUROS | |
| Achat de 100 clés USB personnalisés pour la 2ème réunion du GTSCS | MANDARINE | Bon de commande | 28/11/2019 | 715 000 | 1090 | Marché clôturé |
| Sélection d'un réceptif hôtelier pour l'organisation de la 2ème réunion du GTSCS | PALM BEACH | Demande de cotation | 04/11/2019 | 12 440 000 | 18965 | Marché clôturé |
| Traduction en portugais du contrat cadre des opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches | Gilda Ramato MENDES | Contrat cadre (Bon de commande) | 02/12/2019 | 70 000 | 107 | Marché clôturé |
| Sélection d'un réceptif hôtelier pour l'organisation de l'atelier de formation des inspecteurs des pêches de la Gambie (18 au 20/09/2019) | SENEGAMBIA BEACH HOTEL | Demande de cotation | 27/08/2019 | 1 338 152 | 2040 | Marché clôturé |
| Abonnement de 300 minutes pour 04 postes téléphoniques satellitaires | VISIO CONTACT | Demande de cotation | 06/12/2019 | 964 000 | 1470 | Marché clôturé |
| Traduction en portugais du rapport de l'atelier de lancement du PESCAO | Gilda Ramato MENDES | Contrat cadre (Bon de commande) | 17/01/2020 | 160 000 | 244 | Marché clôturé |
| Traduction en anglais du rapport de la 2ème réunion du GTSCS | Codou DIENE | Bon de commande | 17/01/2020 | 352 530 | 537 | Marché clôturé |
| Organisation d'une pause-café pour la réunion de briefing de l'Opération « SARDINELLE » | LAYU | Demande de cotation | 21/01/2020 | 250 000 | 381 | Marché clôturé |
| Organisation d'une pause-café pour la mission de haut niveau de la CEDEAO | LAYU | Demande de cotation | 19/02/2020 | 330 000 | 503 | Marché clôturé |
| Achat de cartouches pour imprimantes de l'équipe du PESCAO | BUROTIC DIFFUSION | Bon de commande (marché de clientèle) | 22/01/2020 | 346 664 | 528 | Marché clôturé |
| Achat d'un logiciel Microsoft et sept (7) disques durs externes | BUROTIC DIFFUSION | Demande de cotation | 24/03/2020 | 537 944 | 820 | Marché clôturé |

| Dénomination marché | Attributaire | Méthode de sélection | Date signature marche | Montant marche en hors taxes | | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FCFA | EUROS | |
| Acquisition 1 000 masques de protection individuelle anti covid-19 | EXPERT INNOVATION SERVICES | Demande de cotation lancée le 02 juillet 2020 | 09/07/2020 | 3 800 000 | 5793 | Marché clôturé |
| Acquisition de tenues et d'équipements SCS pour les EM | Ets DIALLO & FRERES | Demande de cotation lancée le 11 Septembre 2020 | 19/10/2020 | 9 455 000 | 14414 | Marché clôturé |
| Sélection d'un prestataire relatif a l'impression de cent (100) posters pour le PESCAO | LA ROCHETTE | Demande de cotation lancée le 31 mars 2021 | 18/11/2019 | 999 000 | 1523 | Marché clôturé |
| Acquisition et l'installation d'un dispositif de sécurité incendie dans les bureaux de l'équipe du PESCAO et la formation du personnel | La PIPE | Demande de cotation lancée le 29 juillet 2020 | 02/09/2020 | 1 557 000 | 2374 | Marché clôturé |
| Acquisition et installation d'un système backup pour la visioconférence et d'un dispositif de vidéosurveillance des bureaux de l'équipe du PESCAO | E2f TECHNOLOGIES | Demande de cotation lancée le 21 juillet 2020 | 17/08/2020 | 895 000 | 1364 | Marché clôturé |
| Location d'un bus pour l'organisation d'une session de formation | SUBITO TAXI | Contrat cadre | 09/12/ 2021 | 200 000 | 305 | Marché clôturé |
| Achat fauteuil ergonomique pour l'Assistante du PESCAO | BUROTIC DIFFUSION | Demande de cotation lancée le 18 mars 2021_ : | 11/05/2021 | 130 977 | 200 | Marché clôturé |
| Achat ordinateurs Desk top et onduleur, imprimante couleur et licence Microsoft à vie | OUMOU | Demande de cotation lancée le 07/09/2021 | 07/10/2021 | 1 713 241 | 2612 | Marché clôturé |
| Achat de 60 clés USB et 60 blocs notes | SAREDICA | Demande de cotation lancée le 7/10/2021 | 12/10/2021 | 149 400 | 228 | Marché clôturé |
| Recrutement consultant pour l'amélioration du contenu et du fonctionnement du registre sous régional des pêches | SALEM CHOUIKH | Sélection de consultant individuel lancée le 02/03/2021 | 14/05/2021 | 9 840 000 | 15001 | Marché clôturé |

| Dénomination marché | Attributaire | Méthode de sélection | Date signature marche | Montant marche en hors taxes | | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FCFA | EUROS | |
| Sélection consultant chargé de la traduction des documents de la CSRP en Portugais | Ameth KEBE | Sélection de consultant individuel | 05/10/2021 | 851 000 | 1295 | Marché clôturé |
| Sélection consultant chargé de la traduction des documents de la CSRP en Anglais | Codou DIENE | Contrat cadre | 05/10/2021 | 914 825 | 1395 | Marché clôturé |
| Acquisition de huit (8) téléphones satellitaires et de huit (8) antennes pour téléphone satellitaire | ZERONE Suarl | Demande de cotation lancée le 31 mars 2021 | 12/07/2021 | 5 920 000 | 9025 | Marché clôturé |
| Recrutement d'un Expert en Suivi Evaluation du PESCAO | Assane THIAM | Entente directe | 18/10/2021 | 9 900 000 | 15092 | Fin du contrat en avril 2022 Marché clôturé |
| Sélection d'un réceptif pour l'organisation d'une session de formation | Les Bougainvillées (Saly) | Demande de cotation | 01/12/2021 | 6 020 000 | 9177 | Marché clôturé |
| Sélection d'un consultant d'appui chargé d'élaborer 03 rapports techniques du PESCAO | Assane THIAM | Sélection fondée sur la qualification | 10/06/2021 | 2 500 000 | 3811 | Marché clôturé |
| Sélection d'un consultant juriste pour la rédaction d'un texte consensuel du projet de convention SCS | Bangoura Nabi Souleymane | Sélection de consultant individuel | 16/04/2021 | 3 280 000 | 5000 | Marché clôturé |
| Renouvèlement police d'assurance multirisques des équipements et matériels acquis dans le cadre du PESCAO | NSIA | Avenant de renouvèlement du contrat | 11/10/2021 | 116 287 | 177 | Paiement fait. Période de renouvèlement : 11 octobre 2021 au 10 octobre 2022 Deuxième renouvèlement : 10/10/2022 au 09/10/2023 |
| Acquisition de petit matériel informatique pour le Coordonnateur du PESCAO | **LO MULTIMEDIA** | Demande de cotation lancée le 13 /10/2021 | 15/10/2021 | 22 500 | 34 | Marché clôturé |

| Dénomination marché | Attributaire | Méthode de sélection | Date signature marche | Montant marche en hors taxes | | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FCFA | EUROS | |
| Acquisition de deux splits pour le compte du PESCAO | **MASTER OFFICE DECO** | Demande de cotation lancée le 14 /09/2021 | 22/09/2021 | 661 185 | 1007 | Marché clôturé |
| Traduction du projet de Convention SCS en Portugais | **Amath KEBE** | Bon de commande | 05/10/2021 | 851 000 | 1297 | Marché clôturé |
| Traduction du projet de Convention SCS en Anglais | **Codou DIENE** | Bon de commande | 05/10/2021 | 914 825 | 1395 | Marché clôturé |
| Traduction du rapport de la réunion GT/SCS du 16 au 18 février 2021 | **Codou DIENE** | Bon de commande | 10/03/2021 | 92 500 | 141 | Marché clôturé |
| Traduction du rapport d'activités annuel de la CSRP 2020/2021 | **Codou DIENE** | Bon de commande | 21/02/2022 | 420 970 | 641 | Marché clôturé |
| Traduction du rapport d'activités annuel 2019/2020 | **Ameth KEBE** | Bon de commande | 14/03/2022 | 961 160 | 1 463 | Marché clôturé |
| Acquisition de deux ordinateurs portables pour l'unite de gestion du projet pescao | **OUMOU GROUP** | Demande de cotation lancée le 31 /10/2022 Bon de commande | 24/01/2023 | 1 370 000 | 2089 | Marché clôturé |
| Achat de soixante (60) clés USB pour l'organisation de l'atelier de formation des inspecteurs de peche au Cabo Verde | **NGW SERVICES** | Demande de cotation lancée le 07 /10/2021 Bon de commande | 09/10/2021 | 228 000 | 348 | Marché clôturé |
| **COUT TOTAL DES MARCHES ATTRIBUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE** | | | | **164 679 853** | **251 049** | |
| | | | | | | |

**Remarques :** Au regard du tableau et du diagramme, il est noté ce qui suit :

- Il n'y a **pas** eu **de marché supérieur à 60 000 EUR**. L'acquisition du VMS et AIS sous régional (Equipements SCS), non réalisée, était le seul marché supérieur à 60 000 EUR prévu dans l'action.
- Au total 61 marchés ont été attribués pendant dans la mise en œuvre de l'action, pour un montant de **251 049** Euros (soit **164 679 853** FCFA).
- Les 61 marchés sont attribués suivant des règles légales d'attribution de marché à travers 34 (56%) Demandes de cotation, 14 (23%)Achats Directs, 8 (13%) Contrats cadres, 4 (6%) Sélections de consultants individuels et 1 (2%) Entente directe (**voir la figure n°3 ci-dessous).**
- Tous les 61 marchés attribués ont été exécutés et clôturés.

**Figure n°3 : Présentation des marchés attribués dans la période de référence**

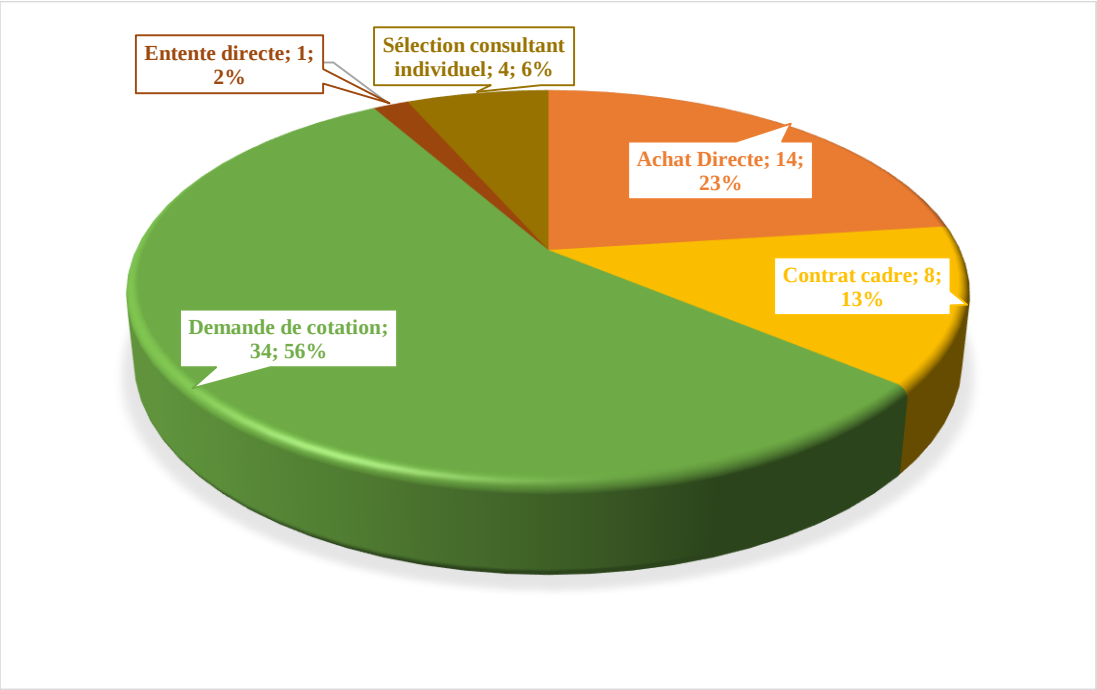

## 3. Bénéficiaires/entités affiliées et autre coopération

### 3.1. Relations entre la CSRP et les autorités publiques des Etats membres.

Le Président et les membres de la Conférence des Ministres ont été régulièrement informés des activités et résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'action. Aussi, les Ministres et / ou leurs Représentants ont toujours procédé à l'ouverture ou au lancement officiel d'activités organisées dans les Etats membres. Presque pour toutes les opérations sous régionales conjointes organisées, le **Ministre** de la pêche de l'Etat membre qui abrite le PSRCO rend visite aux membres du poste. Egalement, les membres de l'équipe du projet en mission dans un EM sont souvent reçus par le Ministre.

### 3.2. Relations entre la CSRP et la DUE-Dakar

L'action est entièrement financée par l'Union européenne qui est l'administration contractante. A ce titre, la Délégation de l'Union Européenne à Dakar (DUE-Dakar) supervise et fait le suivi de la mise en œuvre de l'action. A cet effet, des rencontres virtuelles et /ou téléphoniques ont été régulièrement organisées avec le service opérationnel et financier de la DUE -Dakar pour diverses raisons : **i.** partager l'état d'avance de la mise en œuvre des plans d'action annuels ; **ii.** demander un appui technique et /ou une orientation sur des options de mise en œuvre d'activités ; **iii.** recevoir des feedbacks et recommandations sur le projet de budget de l'Avenant N°1 au contrat de subvention. En outre, la DUE-Dakar a commandité une mission d'audit financier et ROM.

### 3.3. Relations avec les autres organisations prenant part à la mise en œuvre de l'action

- **<u>Bénéficiaires finaux et groupes cibles</u>**

✓ **La Conférence des Ministres**

Lors de la 34e session du comité technique et de la 20e session extraordinaire de la conférence des ministres, organisées les 06, 07 et 08 octobre 2020, la question liée à l'adoption de la convention avait été renvoyée pour mieux étudier les réserves de la Mauritanie et les aspects politiques soulevés par la république de Guinée. Par la suite, un consultant juriste a été recruté. Ce dernier a rédigé un projet de texte consensuel de la convention SCS qui devait être soumis à la prochaine conférence des ministres.

La 21e session ordinaire de la Conférence, présidée par le Ministre de la pêche et de l'économie maritime du Sénégal, a été organisée en présence des 7 Ministre des Etats membres. Conformément à la Convention portant création d'une Commission Sous Régionale des Pêches, la Présidence de la CSRP est revenue à la Gambie et le Secrétariat Permanent à la Mauritanie. A cet effet, **Son Excellence M. Musa S. DRAMMEH**, Ministre de la Pêche, des ressources en eaux et des Affaires de l'Assemblée de la Gambie est Président de la Conférence des Ministres et **Dr Khallahi BRAHIM** est désigné par la Mauritanie comme Secrétaire Permanant de la CSRP. Par ailleurs, il est important de signaler que l'approbation de la convention SCS n'a pas été traitée.

✓ **Le Groupe de Travail Suivi, Contrôle et Surveillance (GTSCS)**

Les membres du GTSCS ont été aussi des partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des activités de l'action. Dans le cadre des quatorze (14) opérations de surveillance, des contrats cadres et sous contrats ont été signés avec eux. A cet effet, les fonds destinés à la réalisation des opérations ont été toujours virés dans le compte de la structure SCS qui livrent à la fin de chaque opération un rapport technique et un rapport financier. De plus, cinq (5) réunions du GTSCS ont été organisées afin de partager et évaluer les résultats de la mise en œuvre des activités.

✓ **Les structures de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) des pêches des Etats Membres**

Les structures SCS et leurs personnels (cadres, inspecteurs, opérateurs radio et VMS et personnels administratifs) ont contribué significativement à la mise en œuvre de l'action. Les salles de conférence des structures SCS ont abrité les différents postes sous régionaux de coordination des quatorze (14) opérations conjointes sous régionales de surveillance organisées. Ces salles ont été également utilisées pour la formation virtuelle d'inspecteurs et d'opérateurs de Centre de Surveillance des Pêches (CSP), co organisées par la CSRP et l'AECP.

- **<u>Autres tiers concernés (incluant les autres donateurs, autres agences gouvernementales ou unités gouvernementales locales, ONG, etc.)</u>**

✓ **L'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)**

L'AECP a apporté à la CSRP de très importantes assistances techniques dans le domaine de la formation, des opérations conjointes de surveillance et l'alignement de cadres juridiques des EM conformément aux normes internationales. A ce titre, l'AECP et la CSRP ont travaillé en étroite collaboration dans la réalisation de différentes activités. Il s'agit de : **i.**

l'organisation de 9 ateliers (virtuels ou présentiels) de formation d'inspecteurs et de contrôleurs des pêches des sept (7) EM ; **ii.** l'organisation de cinq (5) formations des opérateurs de centre de surveillance ; **iii.** l'appui technique de l'Expert dans l'analyse et l'exploitation de données SCS pendant les quatorze (14) opérations conjointes de surveillance organisées ; **iv.** cinq (5) appuis juridiques apportés à 3 Etats membres de la CSRP, notamment le Cabo Verde, la Gambie et la Mauritanie ; **v.** l'appui technique apporté dans la révision et la mise à jour du PAN-INN du Cabo Verde ; et **vi**. l'analyse préliminaire du cadre juridique de la Mauritanie, en vue de l'élaboration de son PAN-INN.

- ✓ **La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS)**

Pour rappel, l'Union Européenne a entièrement financé l'Action via la CEDEAO. Ainsi, la CEDEAO a supervisé et suivi avec intérêt la mise en œuvre des activités de l'action. Dans le cadre du suivi, la CEDEAO envoie chaque année un outil de suivi des indicateurs que la CSRP renseigne et retourne. Aussi, la CEDEAO organise chaque année la réunion du Comité Régional de pilotage pour le suivi des 3 composantes du PESCAO. En plus, la CEDEAO a effectué au niveau de la CSRP deux (2) missions de haut niveau pour évaluer les progrès de l'action.

Par ailleurs, dans le but de renforcer le lien institutionnel avec les structures sous régionales des pêches, un protocole d'accord a été signé entre la CEDEAO, le CPCO et la CSRP. Le protocole vise dans le long terme l'amélioration des relations entre la CEDEAO et les deux organisations régionales de pêche (CSRP et CPCO), qui pourront intervenir comme organes techniques spécialisés de la CEDEAO dans la conception, la planification et la mise en œuvre d'actions et de politiques de pêche et d'aquaculture au niveau régionale.

- ✓ **Le Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO)**

Comme annoncé précédemment, le CPCO, la CSRP et la CEDEAO ont signé un protocole d'accord pour le renforcement du lien entre les parties. Egalement, la CSRP a invité plusieurs fois le CPCO à participer aux opérations sous régionales conjointes de surveillance des pêches.

- ✓ **La Banque Mondiale**

Le programme PRAO de la Banque Mondiale, qui s'était engagé à rendre opérationnel le registre sous régional des navires de pêche, a été clôturé depuis à la fin du mois de décembre 2021. Cependant, durant toute la période de mise en œuvre de l'action, son Expert IT a contribué de façon significative à diverses activités. Il s'agit, entre autres, de : **i.** l'installation des 9 visioconférences ; **ii.** l'appui logistique dans la réalisation des formations en mode virtuel ; **iii.** la supervision de l'amélioration de la fonctionnalité du registre sous régional des pêches ; **iv.** la supervision des 6 ateliers de saisies des données dans le registre ; et **v.** la réalisation des 14 opérations sous régionales de surveillance des pêches.

### 3.4. Consolidation des acquis des autres subventions antérieures reçues de l'UE

La CSRP avait bénéficié des projets SCS/UE/UEMOA ***« Renforcement de la coopération sous régionale pour le suivi, contrôle et surveillance (SCS) des activités de pêche dans la zone de la Commission Sous Régionale des pêches (CSRP) »*** *et GoWAMER* ***« Gouvernance, politiques de gestion des ressources marines gestion des ressources marines et réduction de la pauvreté dans l'Ecorégion WAMER (Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Léone et Cap-Vert)»,*** financés par l'Union Européenne à travers le 9e FED, respectivement dans les périodes de 2010 - 2013 et 2013 -2017.

La mise en œuvre de ces projets avait permis, entre autres, (i) l'organisation de sept **(07)** opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches qui ont eu comme résultats, l'inspection de **549** navires de pêche et l'arraisonnement de **55** chalutiers ; (ii) la dotation des Etats membres et du DSCSA en équipements informatiques et en matériels d'inspection et de contrôle ; et (iii) le renforcement des capacités du personnel technique des structures SCS des Etats membres (cadres, inspecteurs et observateurs des pêches).

Dans la continuité des projets susmentionnés, le programme PESCAO, durant les 5 années de sa mise en œuvre, a organisé **14** opérations conjointes sous régionales de surveillance des pêches qui ont permis d'inspecter **707 navires de pêche et d'en verbaliser 85 pour diverses infractions** (**71** sont liées à la pêche illicite et **14** sont liées à la pêche non déclarée). Le PESCAO a également amélioré, d'une manière significative, les communications entre les salles opérations des structure SCS des Etats membres et celles du DSCSA à travers l'acquisition et l'installation de onze (11) kits de visioconférence et de huit (08) téléphones satellitaires, de sept (07) antennes de téléphones satellites et de huit (08) téléphones smartphones robustes. Le programme a aussi stabilisé l'alimentation en énergie électrique et amélioré la mobilité du DSCSA à Banjul. Aussi, un système backup pour la visioconférence, un dispositif de vidéosurveillance et un dispositif de sécurité incendie ont été installés dans les bureaux de l'équipe du PESCAO. De plus, le PESCAO a

renforcé les capacités de 46 cadres SCS, de 20 formateurs en SCS, de 236 inspecteurs des pêches, dont 27 femmes. En outre le programme a distribué 108 tenues et équipements aux inspecteurs des pêches de six (6) Etats membres.

## 4. Visibilité et Communication sur l'action

Concernant la visibilité et la communication du programme PESCAO, toutes les productions (documents, avis officiels, présentations PowerPoint, etc…) du projet portent les logos de l'UE, de la CEDEAO, de l'UEMOA et du PESCAO. Il en est de même des équipements et matériels sur lesquels sont également apposés les logos des partenaires. En outre un reportage vidéo a été réalisé dans la première année de l'action et les organes de presse (radios, télévisions, presse en ligne, presse papiers) ont été à plusieurs reprises invitées pour couvrir certaines activités de l'action. Par ailleurs, les résultats des activités réalisées sont publiés sur le site web de la CSRP et ont été souvent partagés avec les partenaires pour les inviter à en faire de même dans leurs supports de communication.

Logos des partenaires sur les documents du projet

Réalisation de Banderoles

Logos des partenaires sur les supports de communication

Interviews passées à la télévision, à la radio, au journal et à la presse en ligne

Publications dans le site web de la CSRP et dans les réseaux sociaux

## 5. Lieu d'archivage des dossiers, documents comptables et pièces justificatives

Les dossiers, documents comptables et pièces justificatives de l'action sont archivés dans le bureau du comptable, sis au deuxième étage du siège de la CSRP, qui a été recruté dans le cadre de la mise en œuvre de l'action.

**Annexe 1 : Liste des navires arraisonnés et des infractions.**

| N° | Nom navire et immatriculation | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opération « MORY GNINGUE »** | | | | | | | |
| **01** | **SORAYA 1 DAK 1223** | Sénégal | 17 septembre 2018 | L = 09°55,75' N<br>G = 016°43,48' W | **ZEE GUINEE BISSAU** | Fausse déclaration de tonnage brute | Navire relaxé après confirmation de l'authenticité du certificat de jauge du navire par l'Etat du pavillon (Sénégal) |
| **02** | **SOLEIL 51 DAK 1178** | Sénégal | 20 septembre 2018 | L = 12°48,48' N<br>G = 016°58,09' W | **ZEE SENEGAL** | Capture d'espèces immatures | Navire relaxé car le poids de la seiche n'est pas réglementé par le code de la pêche |
| **03** | **SOLEIL 9 DAK 940** | Sénégal | 20 septembre 2018 | L = 12°58,28' N<br>G = 016°57,81' W | **ZEE SENEGAL** | Capture d'espèces immatures | Navire relaxé car le poids de la seiche n'est pas réglementé par le code de la pêche |
| **04** | **GOLDEN LEAD 1** | Gambie | 21 septembre 2018 | L = 12°58,28' N<br>G = 016°57,81' W | **ZEE GAMBIE** | Absence de journal de pêche et obstruction de mailles | Amende de 17 900 € payée |
| **05** | **YI FENG 17 MMSI 412209006** | Chine | 21 septembre 2018 | L = 13°29' N<br>G = 017°21' W | **ZEE GAMBIE** | Refus de coopérer,<br>Non détention de documents règlementaires | Amende de 44 800 € payée |
| **06** | **YI FENG 18 MMSI 412209007** | Chine | 22 septembre 2018 | L = 13°18' N<br>G = 017°11' W | **ZEE GAMBIE** | Non détention de documents règlementaires | Amende de 44 800 € payée |
| **Opération « BADJIGUI KOUYATE »** | | | | | | | |
| **07** | **BOKE** | Guinée | 01 décembre 2018 | L= 09°57,3'N<br>G= 015°35,9'W | **ZEE GUINEE** | Utilisation d'erses non réglementaires | Avertissement par la commission des arraisonnements |
| **08** | **LIAN RUN 48** | Chine | 01 décembre 2018 | L= 09°20,6'N<br>G= 014°35,5'W | **ZEE GUINEE** | Utilisation d'un dispositif ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée | Amende de 100 000 € payée |
| **09** | **FU YUAN YU 701** | Chine | 03 décembre 2018 | - | **ZEE SIERRA LEONE** | ▪ Maillage non conforme<br>▪ Non déclaration de captures journalières | Information non parvenue |
| **Opération « ALEXANDRE BAPTISTA »** | | | | | | | |
| **10** | **MAYRA** | Cabo Verde | 04 février 2019 | L : 15°58 N<br>G : 022°46 W | **ZEE CABO VERDE** | Sureffectif de l'équipage | Information non parvenue |
| **11** | **VINT7** | Cabo Verde | 04 février 2019 | L : 15°58 N<br>G : 022°46 W | **ZEE CABO VERDE** | Sureffectif de l'équipage | Information non parvenue |
| **12** | **JERUSALEM** | Cabo Verde | 04 février 2019 | L : 15°58 N<br>G : 022°46 W | **ZEE CABO VERDE** | Expiration des documents du Capitaine | Information non parvenue |
| **13** | **KAMOUR** | Mauritanie | 02 février 2019 | L: 18°32,78 N<br>G: 016°40,2W | **ZEE MAURITANIE** | Absence de certificat de sécurité | Information non parvenue |

| N° | Nom navire et immatriculation | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **ESSALAM 3** | Mauritanie | 02 février 2019 | L: 18°47 N<br>G: 016°43W | **ZEE MAURITANIE** | ▪ Absence de rôle d'équipage,<br>▪ Système de congélation de viviers au lieu de glacier conformément à sa licence. | Information non parvenue |
| **15** | **BOUSRA** | Mauritanie | 02 février 2019 | L: 18°42 N<br>G: 016°42 W | **ZEE MAURITANIE** | ▪ Absence de rôle d'équipage,<br>▪ Absence l'échelle pilote. | Information non parvenue |
| **16** | **RISHING 607** | Chine | 03 février 2019 | L : 18°43N<br>G : 016°42.4W | **ZEE MAURITANIE** | ▪ Filet prohibé,<br>▪ Refus d'obtempérer,<br>▪ Journal de pêche non tenu. | Information non parvenue |
| **Opération « KUTA »** | | | | | | | |
| **17** | **FU YUAN YU 217** | Chine | 07 mai 2019 | L : 11°41.26 N<br>G : 016°54.51 W | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Pêche sans autorisation | |
| **18** | **Nom Pirogue 1 non communiqué** | Guinée | 08 mai 2019 | - | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Pêche sans autorisation | Amende de 1525 € payée |
| **19** | **Nom Pirogue 2 non communiqué** | Guinée | 08 mai 2019 | - | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Pêche sans autorisation | Amende de 1525 € payée |
| **20** | **Nom Pirogue 3 non communiqué** | Guinée | 08 mai 2019 | - | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Pêche sans autorisation | Amende de 1525 € payée |
| **21** | **FADA 8** | Guinée | 09 mai 2019 | L : 09°51'N<br>G : 14°06'W | **ZEE GUINEE** | ▪ Absence de permis de pêche original à bord ;<br>▪ Engins de pêche non conforme à la loi et réglementation ;<br>▪ Absence d'agrément technique et sanitaire de navire de pêche ;<br>▪ Absence de journal de pêche à bord. | Amende de 2500 € payée |
| **22** | **FADA 9** | Guinée | 09 mai 2019 | L : 09°51'N<br>G : 14°06'W | **ZEE GUINEE** | ▪ Absence de permis de pêche original à bord ;<br>▪ Engins de pêche non conforme à la loi et réglementation ;<br>▪ Absence de journal de pêche à bord. | Amende de 2500 € payée |
| **23** | **ZALY** | Guinée | 10 mai 2019 | L : 09°22'N<br>G : 13°52'W | **ZEE GUINEE** | ▪ Absence de permis de pêche original à bord ; | Amende de 2500 € payée |

| N° | Nom navire et immatriculation | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ▪ Engins de pêche non conforme à la loi et réglementation ;<br>▪ Absence de journal de pêche à bord. | |
| **24** | **FU YUAN YU 2017** | Chine | 7 mai 2019 | L : 11°41.26 N<br>G : 016°54.51 W | **ZEE GUINEE** | ▪ Pêche sans autorisation | Information non parvenue |
| **25** | **HAI FENG 898** | Chine | 20 mai 2019 | - | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Transbordement en mer non autorisée de produits halieutiques | Amende de 11 434 € payée |
| **26** | **HAI FENG 823** | Chine | 20 mai 2019 | - | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Transbordement en mer non autorisée de produits halieutiques | Amende de 76 225 € payée |
| **27** | **HAI GONG YU 302** | Chine | 20 mai 2019 | - | **ZEE GUINEE BISSAU** | ▪ Transbordement en mer non autorisée de produits halieutiques | Amende de 11 434 € payée |
| **Opération « TESSITO »** | | | | | | | |
| **28** | **MANE BIGUE** | Sénégal | 22 septembre 2019 | L = 11°51’ N<br>G = 017°07’ W | ZEE Guinée Bissau | ▪ Utilisation d’un filet à mono-filament | Amende de 990 € payée |
| **29** | **MAKHTAR CISSE** | Sénégal | 23 septembre 2019 | L = 11°05’ N<br>G = 016°55’ W | ZEE Guinée Bissau | ▪ Utilisation d’un filet à mono-filament | En fuite |
| **30** | **TAXWA ALLA** | Sénégal | 24 septembre 2019 | L = 11°45’ N<br>G = 016°41’ W | ZEE Guinée Bissau | ▪ Capture d’espèces interdites | Amende de 1525 € payée |
| **31** | **ABIB DJALLO** | Ghana | 24 septembre 2019 | L = 11°47’ N<br>G = 016°49’ W | ZEE Guinée Bissau | ▪ Pêche sans autorisation | Amende de 1220 € payée |
| **32** | **CHEIKH S. BOUYA** | Sénégal | 24 septembre 2019 | L = 12°02’ N<br>G = 016°49’ W | ZEE Guinée Bissau | ▪ Pêche sans autorisation | Amende de 990 € payée |
| **33** | **QUNLONG 2** | Gambie | 26 septembre 2019 | L = 13°12,50’ N<br>G = 017°06,30’ W | ZEE Gambie | ▪ Non détention de documents de navigation et non-respect de l’obligation de renseigner le journal de pêche | Amende de 13 513 € payée |
| **34** | **MOHAMED** | Sénégal | 26 septembre 2019 | L = 13°34,00’ N<br>G = 016°54,60’ W | ZEE Gambie | ▪ Maillage du filet non conforme | Relaxe après reprise de la mesure des mailles au port de Banjul |
| **35** | **XIN XI WANG 7** | Chine | 27 septembre 2019 | L = 13°32,40’ N<br>G = 016°54,27’ W | ZEE Gambie | ▪ Non détention de documents de navigation | Amende de 13 513 € payée |
| **Opération « SARDINELLE »** | | | | | | | |
| **36** | **RHIDA-1** | Mauritanie | 23 Janvier 2020 | L = 16°58’,81’’ N | ZEE Mauritanie | ▪ Arraisonné et laissé en zone de pêche | Information non parvenue |

| N° | Nom navire et immatriculation | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | G =016°45',5à''W | | | |
| **37** | **MERZOUGH-1** | Mauritanie | 23 Janvier 2020 | L = 16°54',7'' N G =016°45',72''W | ZEE Mauritanie | ▪ Absence de rôle d'équipage à bord | Information non parvenue |
| **38** | **ATLANTIDE 1** | Turquie | 23 Janvier 2020 | L = 13°28,12'N G = 017°02,41'W | ZEE Gambie | ▪ Journal de bord mal tenu | Information non parvenue |
| **39** | **SARA** | Gambie | 24 Janvier 2020 | L = 13°31,39'N G = 016°59,67'W | ZEE Gambie | • Mouillage sans autorisation dans la réserve naturelle de SANTA LUZIA.<br>• Non détention de certificat maritime par un membre d'équipage.<br>▪ Présence à bord d'un enfant ne figurant pas sur la liste des membres d'équipage ou des passagers. | Information non parvenue |
| **40** | **ITOMA W- 25941** | Cabo Verde | 24 Janvier 2020 | L: 16º44'N G: 024º46'W | EE CABO VERDE | • Mouillage sans autorisation dans la réserve naturelle de SANTA LUZIA.<br>• Non détention de certificat maritime par un membre d'équipage.<br>▪ Présence à bord d'un enfant ne figurant pas sur la liste des membres d'équipage ou des passagers. | Information non parvenue |
| **41** | **DEUS ME ACOMPANHA 3.308-P** | Cabo Verde | 25 Janvier 2020 | L: 14º59'N G: 023º09'W | ZEE CABO VERDE | • Pêche sans autorisation.<br>• VMS inopérant.<br>• Détention de 60 kg de poissons différents à bord, y compris du thon.<br>▪ Un équipage d'équipage qui ne figure pas sur la liste officielle du navire | Information non parvenue |
| **42** | **DEUS ME DEU 2.655-P** | Cabo Verde | 25 Janvier 2020 | L: 15º05'N G: 023º10'W | ZEE CABO VERDE | ▪ Pêche sans autorisation | Information non parvenue |
| **43** | **WAFA-2** | Mauritanie | 25 Janvier 2020 | L: 19°11' N G: 016°49',5'' W | ZEE Mauritanie | ▪ Absence à bord d'un rôle d'équipage | Information non parvenue |

| N° | Nom navire et immatriculation | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **44** | **TOUBA DAK 995** | Sénégal | 25 Janvier 2020 | L : 15°28,58'N G : 017°0,26'W | ZEE Sénégal | ▪ Non détention à bord du talon de licence de pêche en cours de validité | Information non parvenue |
| **45** | **ISLA DE SANTA** | Espagne | 26 Janvier 2020 | L : 18°22'N G : 016°43'.03''W | ZEE Mauritanie | ▪ Présence non justifiée de 05 marins | Information non parvenue |
| **46** | **DAVUT KIYAK-A** | Turquie | 26 Janvier 2020 | L : 18°26'N G : 016°16'.83W | ZEE Mauritanie | ▪ Absence à bord d'un certificat de sécurité | Information non parvenue |
| **Opération « SIZU »** | | | | | | | |
| **47** | PLAYA DE DAKAR | Sénégal | 28 août 2021 | L=15°25,82'N-G=017°17,41'W | ZEE SENEGAL | ▪ Maillage non conforme | Non-lieu déclaré ; l'infraction n'est pas constituée |
| **48** | HISPASEN 5 | Sénégal | 28 août 2021 | L=15°36,58'N-G=017°11,74'W | ZEE SENEGAL | ▪ Maillage non conforme | Non-lieu déclaré ; l'infraction n'est pas constituée |
| **49** | SERRA DE DAKAR DAK 1213 | Sénégal | 28 août 2021 | L=15°28,61'N-G=017°10,48'W | ZEE SENEGAL | ▪ Maillage non conforme | Non-lieu déclaré ; l'infraction n'est pas constituée |
| **50** | JIN SHENG SHUE | Mauritanie | 26 Aout 2021 | L: 20°13',200''N G :017°16',500''W | ZEE MAURITANIE | ▪ Doublure de la poche du chalut | Arraisonné et laissé en zone de pêche |
| **51** | FELICIDADE | Cabo Verde | 28 Aout 2021 | Sul de Sao Nicolau | ZEE CABO VERDE | ▪ Sans licence de pêche à bord | Demande de présentation d'un permis de pêche validité |
| **52** | NHA FEMA | Cabo Verde | 26 Aout 2021 | Tarrafal de Monte Trigo - Santo Antão | ZEE CABO VERDE | ▪ Sans licence de pêche à bord | - Demande et attribution d'un permis de pêche<br>- Amende de **18 600 euros** |
| **Opération « SEYDOUBA CAMARA »** | | | | | | | |
| **53** | **ALANANA** (pirogue) | Guinée | 22 novembre 2021 | L=09˚42'N G=013˚55'W. | ZEE GUINEE | ▪ Pêche non autorisée | Information non parvenue |
| **54** | **FODE CAMARA** (pirogue) | Guinée | 22 novembre 2021 | L=09˚42'N G=013˚55'W. | ZEE GUINEE | ▪ Pêche non autorisée | Information encore parvenue |
| **55** | **FATOUMATA BANGOURA** (pirogue) | Guinée | 22 novembre 2021 | L=09˚56.4'N G=014˚32.7'W. | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation. | Information non parvenue |
| **56** | **AIR YOROGO 2** (pirogue) | Guinée | 22 novembre 2021 | L=09˚56.4'N G=014˚32.7'W. | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation. | Information non parvenue |
| **57** | **HAI FENG 88** | Guinée | 24 novembre 2021 | L=10°54'N G=016°42'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Absence de licence valide | Information non parvenue |
| **58** | **MBAI MATAR DIOP** | Sénégal | 24 novembre 2021 | L=11°01'N G=016°45'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Pêche sans licence. | Information non parvenue |

| N° | Nom navire et immatriculation (pirogue) | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opération « CRE MOHAMED LEMINE LEFDHAL »** | | | | | | | |
| **59** | **MASEOUD 1** | Sénégal | 12 février 2022 | L=12°23,50'N-G=017°15,51'W | ZEE SENEGAL | ▪ ERSE | Amende de **7 622,45 euros** |
| **60** | **MASEOUD 3** | Sénégal | 12 février 2022 | L=12°21,10'N-G=017°13,30'W | ZEE SENEGAL | ▪ ERSE | Amende de **7 622,45 euros** |
| **61** | **FATIMA** | Sénégal | 13 février 2022 | L=12°55,68'N-G=017°16,75'W | ZEE SENEGAL | ▪ Journal non paraphé | Amende de **12 196 euros** |
| **62** | NOUH-1 | Mauritanie | 13 février 2022 | L: 20°11,96'N G :017°32,77''W | ZEE MAURITANIE | ▪ Présence d'une chaine intégrée au filet. | Arraisonné et laissé en zone de pêche |
| **63** | ANDALLA-2 | Mauritanie | 15 février 2022 | L :18°47N G : 016°43W | ZEE MAURITANIE | ▪ Défaut de marquage | Arraisonné et laissé en zone de pêche |
| **64** | HABIBIN-YAVUZ | Turquie | 15 février 2022 | L :18°32'N G : 016°21.4'W | ZEE MAURITANIE | ▪ Présence non justifiée d'un marin étranger | Arraisonné et laissé en zone de pêche |
| **65** | ESSAVA-2 | Mauritanie | 16 février 2022 | L :17°32'N G : 016°22.00'W | ZEE MAURITANIE | - Chaine racleuse<br>▪ Doublage de 200 mm au lieu de 300 mm | Arraisonné et dérouté sur Nouadhibou |
| **66** | WIDAD-3 | Mauritanie | 17 février 2022 | L :17°03'N G : 016°28'W | ZEE MAURITANIE | ▪ - Absence de pavillon - Présence d'une chaine racleuse | Arraisonné et laissé en zone de pêche |
| **67** | SAPECHE-1 | Mauritanie | 18 février 2022 | L :18°43N G : 016°42.4W | ZEE MAURITANIE | - Présence d'un marin étranger de plus<br>- Dissimulation de l'indicatif radio aérien<br>▪ absence du passeport du capitaine | Arraisonné et laissé en zone de pêche |
| **68** | **JESUS** | Cabo Verde | 14 février 2022 | Sal | ZEE CABO VERDE | ▪ Sans licence de pêche | - Demande et attribution d'un permis de pêche<br>- Amende de **18 600 euros** |
| **69** | **FIDJO DE SERGILO** | Cabo Verde | 15 février 2022 | Sal | ZEE CABO VERDE | ▪ Sans licence de pêche | Demande et attribution d'un permis de pêche |
| **70** | **BENFICA** | Cabo Verde | 17 février 2022 | Sao Nicolau | ZEE CABO VERDE | ▪ Sans licence de pêche | - Demande et attribution d'un permis de pêche<br>- Amende de **18 600 euros** |
| **Opération « STINGRAY »** | | | | | | | |

| N° | Nom navire et immatriculation | Pavillon | Date arraisonnement | Position | Zone | Motif | Mesures prises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71** | RUI TAI FENG 905 | Chine | | L=09°47,74'N-G=015°20,35'W | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation | Information non parvenue |
| **72** | N'ZALY | | 23 avril 2021 | L=09°,18'N-G=013°,40'W | ZEE GUINEE | ▪ Refus d'obtempérer (Refus de présenter les documents) | Information non parvenue |
| **73** | ENFANT NOIR | | 24 avril 2021 | L=09°,19'N-G=013°,44'W | ZEE GUINEE | ▪ Balise VMS non opérationnelle et maillage non conforme | Information non parvenue |
| **74** | PILOT WHALE | Cameroun | 27 avril 2021 | L=10°18,79'N-G=016°18,97'W | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation de pêche | Amende de 400 000 USD payée à la Guinée par l'armateur |
| **75** | FU YUAN YU 130 | Chine | | | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Maillage non conforme | Information non parvenue |
| **76** | TIAN YI HE 06 | Chine | | | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Transbordement sans autorisation, dans une zone interdite | Information non parvenue |
| **77** | NETO DE BORA | Guinée | 28 avril 2021 | L=11°46 …N-G=017°01'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Utilisation de mono filament dans une zone de pêche industrielle | Information non parvenue |
| **78** | YAYE NDEYE NDIAYE | Sénégal | 28 avril 2021 | L=11°47 …N-G=017°00'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Pêche sans licence et dans une zone de pêche industrielle | Information non parvenue |
| **79** | OUSMANE NDIAYE | Sénégal | 28 avril 2021 | L=11°43 …N-G=017°02'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Utilisation de mono filament dans une zone de pêche industrielle | Information non parvenue |
| **80** | ABDOU RAMANE SECK | Sénégal | 28 avril 2021 | L=11°45 …N-G=017°02'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Pêche sans licence et dans une zone de pêche industrielle | Information non parvenue |
| **81** | SERIGNE BABACAR | Sénégal | 28 avril 2021 | L=11°42 …N-G=017°02'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Pêche sans licence et dans une zone de pêche industrielle | Information non parvenue |
| **82** | JULES FRANCOIS BOCANDE | Ghana | 29 avril 2021 | L=11°36,45'N-G=016°47,40'W | ZEE GUINEE BISSAU | ▪ Pêche sans licence et dans une zone de pêche industrielle | Information non parvenue |
| **Opération « BICA »** | | | | | | | |
| **83** | GUOJIN 908 | Chine | 16 mai 2022 | Détectée par VMS | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation | Amende de 400 000 USD payee à la GUINEE par l'armateur |
| **84** | RUTTAI FENG 805 | Chine | 19 mai 2022 | L=09˚28.59'N G=015˚34.02'W | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation | Documents saisis et navire dérouté |
| **85** | FU YUAN YU 372 | Chine | 19 mai 2022 | L=09˚30.08'N G=014˚58.06'W | ZEE GUINEE | ▪ Pêche sans autorisation | Documents saisis et navire dérouté |
| | | | | | | | |

Nom de la personne de contact pour l'action :

**Dr Khallahi BRAHIM**, **Secrétaire Permanant de la CSRP**

Signature : ……

Lieu : Dakar

Échéance prévue du rapport : **30/07/2023**

Date d'envoi du rapport : ……
